



د افغانستان اسلامي جمهوریت

گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی دولت طی ربع دوم سال مالی 1400



سرطان 1400

فهرست مندرجات

1 مقدمه:

2 خلاصه گزارش:

4 تحلیل مختصر سکتوری:

12 شرح گزارش:

35 نتیجه گیری:

36 چالش ها:

37 پیشنهادات:

مقدمه

وزارت اقتصاد گزارشات میزان پیشرفت و چگونگی وضعیت پروژه های انکشافی را بصورت ربعوار تحلیل و به گونه رسمی با کابینه ج.ا.ا شریک می سازد. این گزارش، وضعیت کلی پروژه های انکشافی و مصرف موثر بودجه انکشافی را طی ربع دوم سال مالی 1400، مورد تحلیل و بررسی قرار داده، چالش های عمده روند تطبیق پروژه های انکشافی را شناسایی و پیشنهادات مشخص را بخاطر حل مشکلات فرا راه روند تطبیق موثر پروژه های انکشافی، پیشکش می نماید.

سرمایه گذاری دولت روی پروژه های انکشافی، میتواند از دو بعد، بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش ایفا نماید. **اول:** سرمایه گذاری روی تولیدات و خدمات داخلی، کشور را از وابستگی به محصولات خارجی نجات و بسوی


خودکفایی سوق خواهد داد. همچنان، این عمل سبب تشویق تولیدات و عرضه خدمات در داخل کشور گردیده و در واقع منتج به رشد و توسعه اقتصادی میگردد.

دوم: مصارف دولت در پروژه های انکشافی صرف به مثابه هزینه روی پروژه های انکشافی نبوده، بلکه، سبب ایجاد فرصت های کاری، کاهش فقر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود رفاه عامه، نیز میگردد.

بناء، با درنظرداشت موارد فوق، نیاز است تا واحد های محترم بودجوی، پروژه های انکشافی خویش را مطابق میعاد معین، تطبیق و در قسمت بلند بردن سطح مصارف انکشافی شان به شکل موثر و با درنظر داشت اصل صرفه جویی تلاش نمایند.

حالت پروژه های انکشافی الی ختم

ربع دوم سال مالی 1400

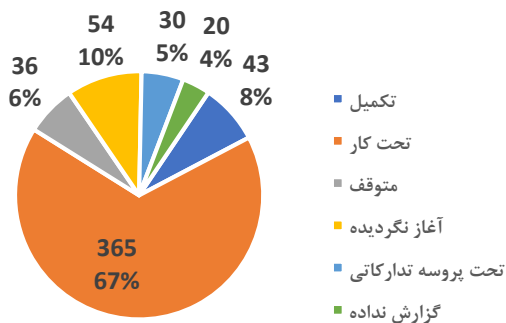

وضعیت پروژه های انکشافی طی ربع دوم سال مالی 1400

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور حصول اولویت های انکشافی خویش، طی سال مالی 1400 به تعداد 548 پروژه انکشافی را تصویب و منظور نموده که مجموع بودجه آن بالغ بر (168.24) میلیارد افغانی میگردد از آن جمله مبلغ (85.68) میلیارد آن بودجه اختیاری و مبلغ (82.55) میلیارد آن بودجه غیر اختیاری میباشد.

حالت کنونی پروژه های انکشافی منظور شده، چنین ارایه میگردد:

✓ 43 پروژه تکمیل (از جمله 24 پروژه در سال قبل و 19 پروژه در

این ربع تکمیل گردیده است)؛

✓ 365 پروژه در حال تطبیق؛

✓ 30 پروژه تحت پروسه تدارکات؛

✓ 36 پروژه متوقف؛

✓ 54 پروژه آغاز نگردیده،

✓ و از تعداد 20 پروژه گزارش ارئه نگریده است (18 پروژه مربوط

اداره هوانوردی ملکی و 2 پروژه مربوط اداره مستقل ارگان های

محلی) می باشند.

لازم به تذکر است که از تعداد 548 پروژه انکشافی به تعداد:

✓ 25 پروژه جدید؛

✓ 523 پروژه انتقالی، میباشد.

از مجموع بودجه انکشافی، طی ربع دوم سال مالی 1400، مبلغ 37.71

میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده که 22 درصد بودجه انکشافی سال

مالی را احتوا می نماید.

نوت: از مجموع 33 پروژه تکمیل؛ کار فیزیکی تعداد 24 پروژه آن در سال قبل

تکمیل گردیده، اما نسبت دوره تسلیمی و رفع نواقص تا کنون شامل

سند بودجه ملی می باشد.

از لحاظ سرمایه گذاری عمومی بودجه انکشافی، بیشترین سهم سرمایه گذاری برای سکتور زیربنا و منابع طبیعی (46.3٪)، سپس زراعت و انکشاف دهات (21٪)، اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی (8.6٪) و متعاقباً سکتور های حکومتداری و صحت (8٪)، و کمترین وجوه انکشافی به سکتور امنیت (1.3٪) اختصاص داده شده است.

در بودجه انکشافی سال مالی 1400، بیشترین سهم بودجه اختیاری به سکتور زیربنا و منابع طبیعی (55.1٪) و کمترین سهم به سکتور مصئونیت اجتماعی (1.4٪) اختصاص یافته است.

بیشترین فیصدی مصرف بودجه انکشافی طی همین ربع سال مالی، در سکتور های صحت (39٪)، امنیت (28٪) صورت گرفته است.

در حال که در عین میعاد در سال مالی 1399 بیشترین فیصدی مصرف در سکتور حکومتداری (52٪) صورت گرفته بود.

افغانی 37.71 میلیارد 22٪

مصرف الی اخیر ربع دوم سال مالی 1400


اوسط پیشرفت کار الی ختم ربع دوم سال مالی 1400 23٪

توضیح مختصر پیشرفت کار و مصرف بودجه پروژه های انکشافی به تفکیک سکتور ها

وضعیت پروژه های انکشافی طی ربع دوم سال مالی 1400														
چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیارد افغانی)														
سکتور ها	تعداد پروژه	تکمیل		تحت کار	تحت پروسه تدارکاتی	متوقف	آغاز نگردیده	گزارش نداده	پیشرفت کار اوسط	اختیاری	غیر اختیاری	مجموع	مصرف بودجه	فیصدی مصرف
		سال قبل	ربع دوم											
امنیت	27	0	0	26	1	0	0	0	20%	2.01	0.15	2.16	0.61	28%
حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر	39	0	2	32	2	0	1	2	19%	5.55	7.93	13.48	2.35	17%
زیربنا و منابع طبیعی	242	22	8	120	16	21	37	18	17%	47.24	30.69	77.93	16.38	21%
معارف	66	0	4	49	5	6	2	0	41%	5.28	2.20	7.48	1.00	13%
صحت	44	1	1	34	3	5	0	0	36%	4.40	8.91	13.31	5.25	39%
زراعت و انکشاف دهات	50	0	2	43	3	2	0	0	18%	11.90	23.37	35.27	8.34	24%
مسئولیت اجتماعی	34	1	2	16	0	2	13	0	12%	1.23	2.94	4.17	0.23	5%
اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی	46	0	0	45	0	0	1	0	21%	8.08	6.36	14.44	3.55	25%
مجموع	548	24	19	365	30	36	54	20	23%	85.68	82.55	168.24	37.71	22%

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS


سهم سکتور ها در مصرف بودجه انکشافی ربع دوم سال مالی 1400

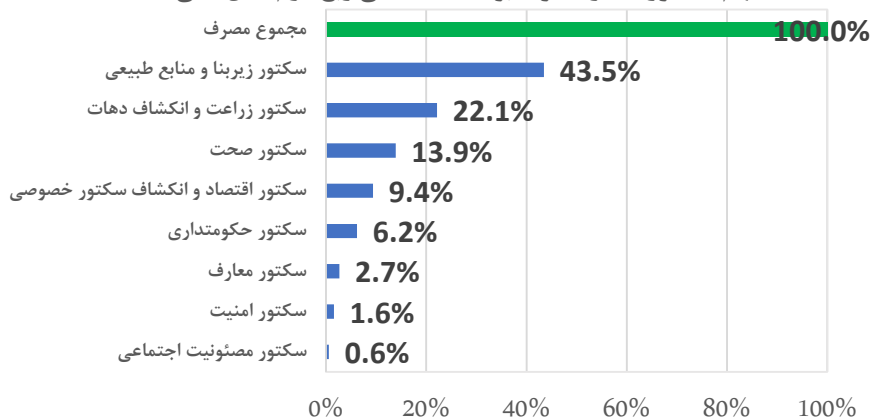

از لحاظ سهم سکتور ها در مصرف بودجه انکشافی، بیشترین حجم مصرف را سکتور های زیربنا و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، صحت و کمترین مقدار مصرف را سکتور مسئولیت اجتماعی الی ختم ربع دوم سال مالی 1400 داشته اند.

جزئیات در جدول و گراف نشان داده شده است.

مقایسه فیصدی مصرف بودجه انکشافی طی ربع دوم سال های مالی 1399 و 1400

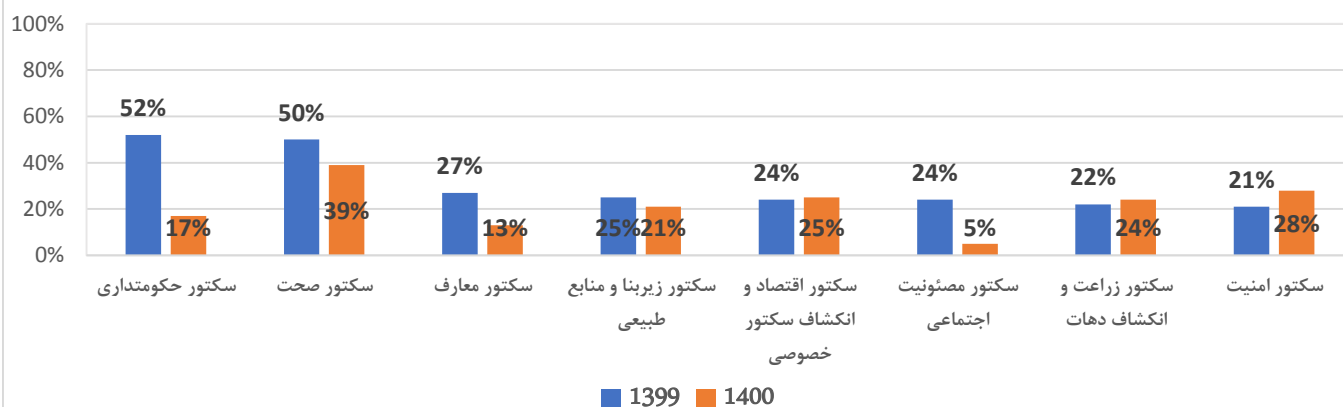


در ربع دوم سال مالی 1400، جمعاً به تعداد 548 پروژه انکشافی شامل پلان سال بوده که بیشترین آن مربوط سکتور زیر بنا و منابع طبیعی (242) پروژه و کمترین مربوط سکتور امنیت (27) میباشد.

مجموع بودجه انکشافی ربع دوم سال مالی 1400، بالغ بر (168.24) میلیارد افغانی گردیده که منجمله مبلغ (85.68) میلیارد افغانی (51٪) آن شامل بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ (82.55) میلیارد افغانی (49٪) آن شامل بودجه انکشافی غیراختیاری میگردد.

فیصدی سهم سکتورها به اساس بودجه اختیاری و غیر اختیاری


دایره کوچک بودجه اختیاری و دایره بزرگ بودجه غیر اختیاری:

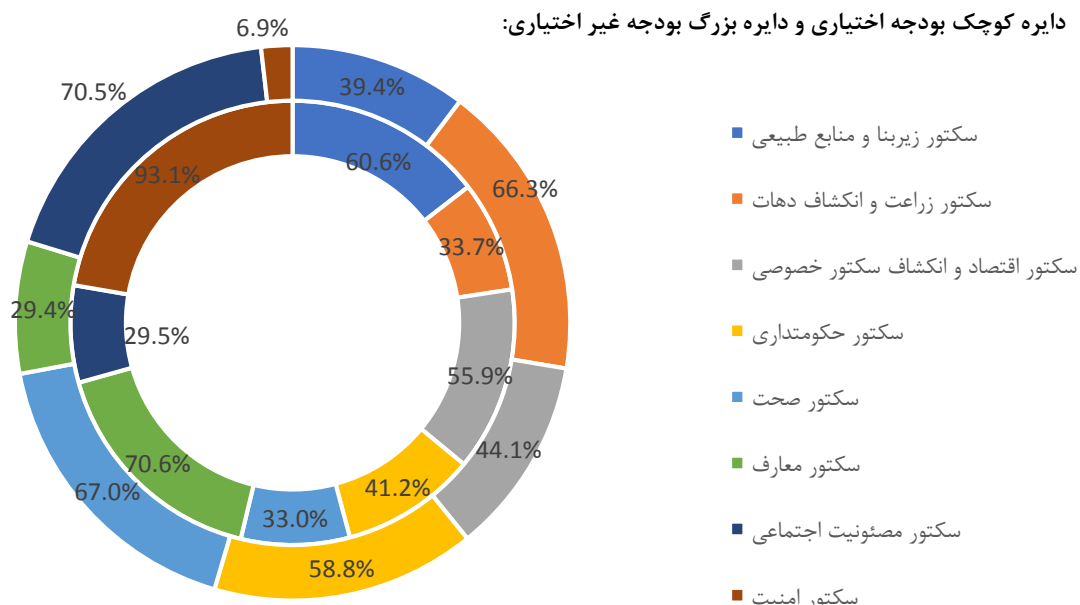


جگونگی تحقق بودجه و میزان پیشرفت کار پروژه های انکشافی به تفکیک ولایات:

مجموع بودجه انکشافی سال مالی 1400 برای ولایات بالغ بر (91.55) میلیارد افغانی میگرد که از آن مبلغ (20.45) میلیارد افغانی (حدود 22 درصد) طی ربع دوم سال مالی 1400 به مصرف رسیده است. بیشترین فیصدی مصرف بودجه در ولایات میدان وردک، کاپیسا و کندز بالترتیب 49٪، 38٪، 36٪ میباش، صورت گرفته است.

فیصدی مصرف پروژه های انکشافی به تفکیک ولایات الی اخیر ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰

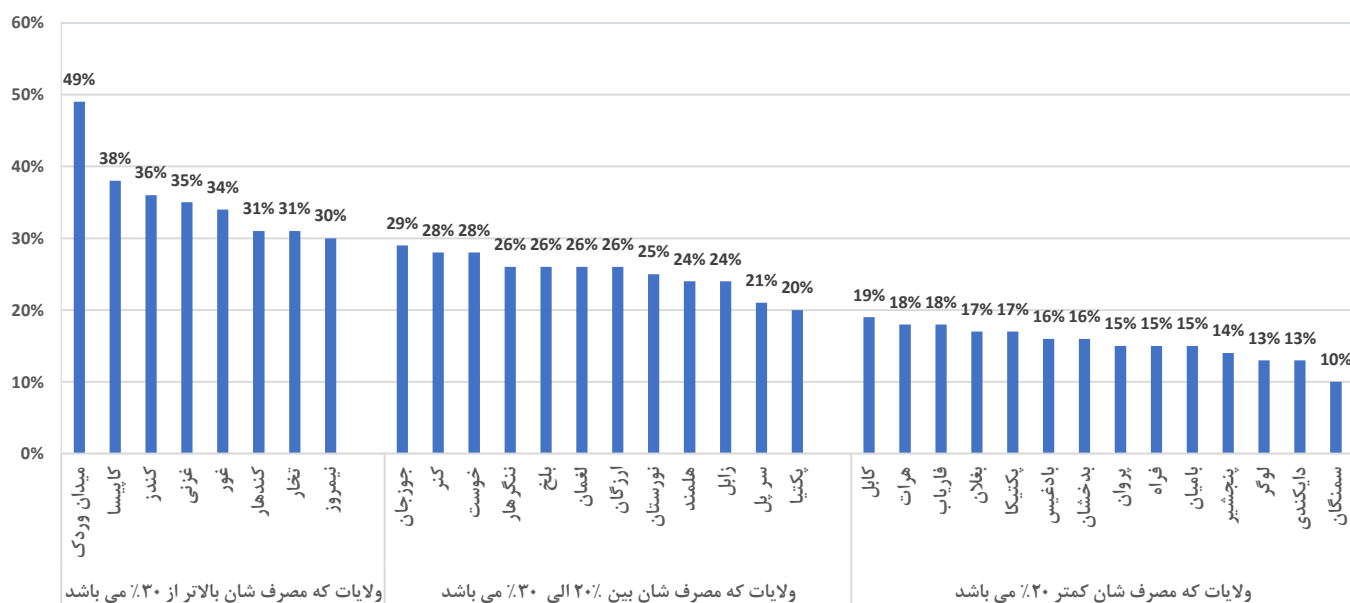

فیصدی پیشرفت کار پروژه های انکشافی به تفکیک ولایات الی اخیر ربع دوم ۱۴۰۰

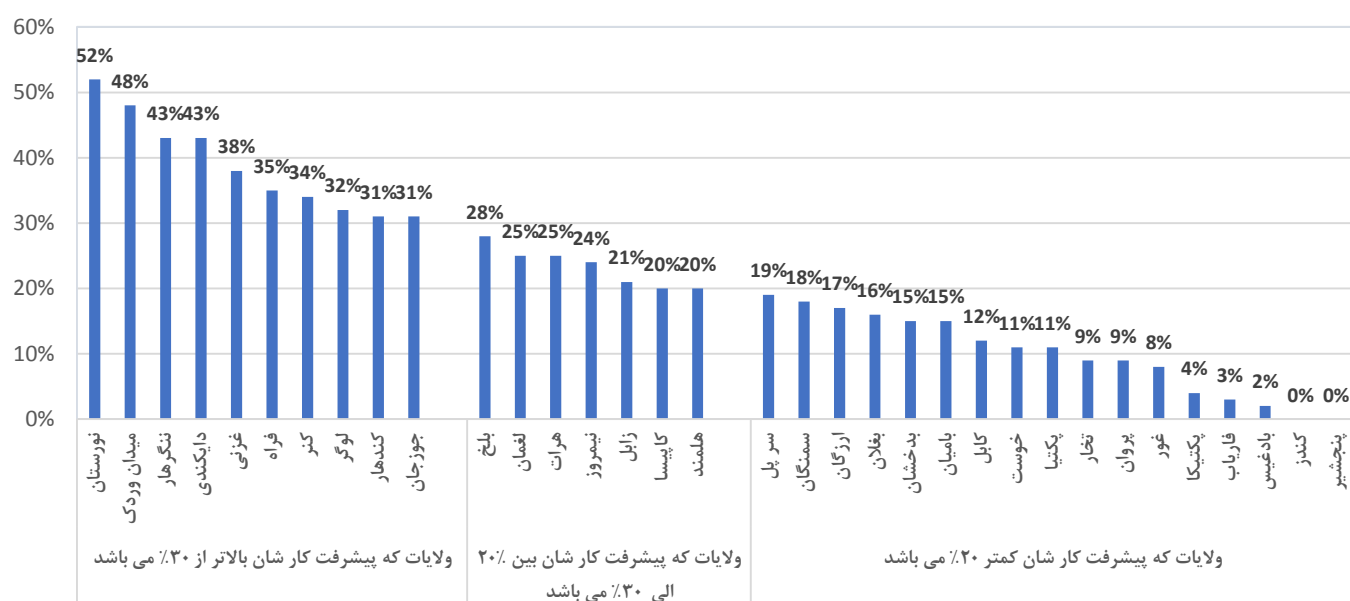

جدول توحیدی چگونگی تحقق بودجه و وضعیت پروژه های انکشافی به تفکیک ولایات طی ربع دوم سال مالی 1400

ولایات	اختیاری	غیر اختیاری	مجموع بودجه	مصرف	فیصدی مصرف	پیشرفت کار	تکمیل	در حال تطبیق	متوقف	ناشده آغاز لغو	تدارکات	مجموع
کابل	8,068,201,291	8,774,439,406	16,842,640,697	3,165,280,527	19%	12%	5	83	3	3	0	97
هرات	5,019,559,677	2,367,880,450	7,387,440,127	1,314,937,158	18%	25%	0	34	0	30	11	75
پروان	863,086,748	4,040,251,992	4,903,338,740	753,762,558	15%	9%	2	39	0	25	0	66
کندهار	2,449,428,151	1,823,516,265	4,272,944,416	1,326,650,227	31%	31%	3	51	1	7	2	73
ننګرهار	1,404,036,237	2,603,896,229	4,007,932,466	1,023,684,714	26%	43%	5	34	2	33	0	82
جوزجان	1,924,832,315	2,046,429,834	3,971,262,149	1,160,261,356	29%	31%	9	39	1	9	0	58
کنډز	878,551,309	2,915,629,819	3,794,181,128	1,348,453,031	36%	0%	0	58	0	1	0	59
بادغیس	1,104,834,991	2,480,294,204	3,585,129,195	586,394,879	16%	2%	1	46	0	1	0	48
تخار	1,763,755,499	1,518,440,728	3,282,196,227	1,011,103,909	31%	9%	1	55	0	0	0	57
سمگان	560,073,465	2,644,067,324	3,204,140,789	304,684,045	10%	18%	3	44	1	1	0	51
نیروز	2,818,146,993	255,472,151	3,073,619,144	936,407,971	30%	24%	3	32	0	8	0	45
بلخ	1,265,111,982	1,575,064,379	2,840,176,361	725,069,908	26%	28%	7	53	0	2	0	67
فراه	2,205,103,789	235,129,366	2,440,233,155	374,970,674	15%	35%	0	11	0	38	0	51
بامیان	500,961,936	1,902,813,101	2,403,775,037	355,570,603	15%	15%	2	50	0	8	1	61
بقالن	1,125,313,643	1,011,193,008	2,136,506,651	372,031,166	17%	16%	2	56	0	2	0	61
قاریاب	1,779,482,416	330,387,880	2,109,870,296	371,648,876	18%	3%	1	54	1	1	0	60
کنر	794,831,109	1,125,665,714	1,920,496,823	531,104,787	28%	34%	1	21	0	25	0	51
لورګر	1,393,918,739	495,726,870	1,889,645,609	240,662,311	13%	32%	7	43	1	8	0	62
خوست	1,288,166,699	377,443,796	1,665,610,495	472,784,272	28%	11%	3	38	1	18	1	62
پکتیا	1,239,255,655	369,666,212	1,608,921,867	321,580,756	20%	11%	1	63	1	0	0	65
میدان وردک	1,300,962,762	267,160,639	1,568,123,401	767,173,775	49%	48%	5	29	2	8	2	51
هلمند	1,003,010,015	535,048,862	1,538,058,877	362,300,517	24%	20%	2	50	0	1	0	53
بدخشان	524,062,149	872,653,845	1,396,715,994	226,393,993	16%	15%	2	35	2	10	0	52
لغمان	1,051,069,100	284,432,171	1,335,501,271	344,980,532	26%	25%	0	39	0	8	0	50
دایکندي	957,364,515	325,240,473	1,282,604,988	171,744,016	13%	43%	1	30	4	7	0	47
غزنی	714,710,580	378,396,638	1,093,107,218	384,802,389	35%	38%	3	28	4	12	1	53
پکتیکا	732,886,241	260,584,318	993,470,559	165,714,953	17%	4%	0	37	1	11	2	52
غور	548,827,288	326,106,434	874,933,722	297,742,416	34%	8%	1	49	0	1	0	51
کاپیسا	570,571,395	283,849,013	854,420,408	323,613,329	38%	20%	2	48	0	0	0	50
سر پل	642,433,849	174,092,751	816,526,600	171,342,245	21%	19%	2	36	2	4	0	44
نورستان	270,393,562	384,941,932	655,335,494	165,024,993	25%	52%	1	16	2	16	0	37
پنجشیر	553,240,543	88,723,743	641,964,286	92,729,431	14%	0%	0	40	0	0	0	40
زابل	401,662,876	196,055,796	597,718,672	143,333,465	24%	21%	3	22	0	22	0	48
ارزگان	340,031,301	221,757,154	561,788,455	144,824,066	26%	17%	0	16	2	24	0	46
مجموع	48,057,878,820	43,492,452,497	91,550,331,317	20,458,763,848	22%	21%	78	1379	31	344	9	1925

نوت: ارقام بودجوی به افغانی می باشد.

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

سکتور زیربنا و منابع طبیعی:

برشنا شرکت:

- امضاء قرارداد پروژه لین انتقال 220 کیلو ولت از غزنی به پکتیا که با تطبیق آن تامین برق مورد نیاز ولایت مرفوع میگردد؛
- وصل برق توریدی ترکمنستان به سب استیش (kv 220) مزارشریف از طریق لین انتقالی (kv 220) شبرغان_ مزارشریف به طول 114 کیلومتر با نصب پایه ها به بهره برداری سپرده شد که ۸۷ میگاوالت انرژی برق ترکمنستان را جذب و مشکل کمبود برق شهر مزارشریف مرفوع میگردد.

اداره ملی تنظیم امور آب:

- امضا قرارداد مطالعات، دیزاین و ساختمان 42 بند کوچک و بزرگ که با تطبیق آن 847.1 میلیون متر مکعب آب ذخیره، 61.1 میگاوالت برق تولید و 211,239 هکتار زمین آبیاری میگردد؛
- امضا قرارداد اعمار بند شاه توت قریه لندر ولایت کابل میان دولت افغانستان و کشور هندوستان به ارزش ۲۸۶ ملیون دالر؛
- آغاز آبیگری بند کمال خان ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز که ظرفیت آبیاری 174,000 هکتار اراضی و تولید 9 میگاوالت برق را داشته و از آن ۴۹ هزار خانواده بطور مستقیم مستفید میشوند.

وزارت شهرسازی و اراضی:

- ثبت ۴۸۰ هزار جریب زمین دولتی در ننگرهار؛
- ترتیب پلان های انکشافی برای زمین های دولتی در مرکز و پنج شهر بزرگ.

شهرداری کابل:

- استرداد موازی 100 جریب زمین غصب شده مربوط ساحات سبز در سرک کابل جلال آباد از طرف شهرداری کابل؛
- تطبیق پلان عملیاتی نظم شهری در جاده سلطان محمود غزنوی و در ساحات چهار راهی دوم پروژه احمد شاه بابا مینه.

اداره انکشاف زون پایتخت:

- اعمار منازل رهائشی برای مهاجرین و احداث 377 متر سرک جغل فرش کوه قزل؛
- احداث شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب شهرک مهاجرین مموزی ولایت کابل؛
- احداث 4,177 کیلومتر دیوار احاطوی ترمینل چهار آسیاب.

سکتور معارف:

- جذب تعداد 970,498 شاگرد در برنامه تعلیمات عمومی که از جمله 503,198 ذکور و 367,300 اناث میباشند؛
- آموزش تعداد 927 تن معلم و کارمندان مرکز و ولایات در بخش طرزالعمل ارزیابی ارتقای ظرفیت و همچنان استخدام تعداد (9,652) تن معلم و کارمند در مرکز و ولایات؛
- انتقال 5,917 قلم آثار مختلف النوع باستانی و با ارزش از مس عینک به مرکز؛
- استحکام بندی دو مغاره و کشف یک تعداد آثار منقول شامل پارچه های ظروف سفالی، پارچه های استخوان و آثار غیر منقول آن شامل چندین ساختمان سنگی بقایای اندک از دیوار سنک کاری دهلیز راه زینه در ساحه باستانی بالا حصار کابل؛
- افزایش تعداد مراکز آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی از 42 باب به 382 باب؛
- ایجاد 12 مرکز PDC در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و همچنان ایجاد کمپیوتر لب در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی (نورستان، تخنیکی غزنی، پنجشیر، نیمروز و ارزگان)؛
- ایجاد صنوف آنلاین برای پوهنتون های مرکز و ولایات (کابل، طبلی کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولی تخنیک کابل، کندهار، هرات ننگرهار، بلخ و شیخ زاید خوست)؛
- تطبیق پروژه ارایه خدمات از طریق کیبل فایبر نوری برای 35 کمپس مؤسسه تحصیلی و تهیه انترنت و ایمکس برای مؤسسات تحصیلات عالی (بادغیس، سرپل، پنجشیر، نیمروز، زابل، شفاخانه تدریسی البیرونی، فاریاب، ارزگان، دایکندی، فراه و غور)؛

سکتور صحت:

- ایجاد شغل موقت در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی سکتور صحت برای تعداد (18,659) تن ذکور و (6,035) تن اناث؛
- ترتیب پالیسی ملی صحت برای سال های 2021-2030 و همچنان احذ و تسلیمی زمین برای اعمار شفاخانه 200 بستر امراض سرطان در ولایت کابل؛
- عرضه خدمات صحی برای 7748 تن مریضان سرطانی که از این جمله 5528 تن خدمات سراپا، و 2220 تن خدمات داخل بستر را دریافت نموده اند. ضمنا به تعداد 530 تن از خدمات جراحی مستفید گردیده اند؛
- ایجاد مراکز پی سی آر جهت تشخیص کووید 19 در ولایات نورستان، کندز، تورغندی هرات، بندر آقینه ولایت فاریاب، کندهار، پروان و پنجشیر با همکاری سازمان صحی جهان؛
- اعمار شفاخانه های 400 بستر کمپلکس در ولایت کابل و 100 بستر در ولایت پکتیا جهت تداوی و درمان بیماری کرونا.

سکتور زراعت و انکشاف دهات:**الف: وزارت زراعت، آبیاری و مالداري:**

- ایجاد آبریزه بمنظور تقویت سیستم آبیاری 150 هکتار ساحات جدید؛
- احداث 700 هکتار زمین باغات بمنظور بلند بردن ارزش، کمیت و کیفیت میوه جات؛
- حفظ و مراقبت 2508 هکتار ساحه به بطور متواتر و همچنان احداث 3262 باغچه های خانگی با نصب سیستم آبیاری قطره ئی پروژه در 8 ولایت.

ب: وزارت احیاء و انکشاف دهات:

- ایجاد شغل دایمی و موقت برای تعداد (1,287,063) تن که از جمله تعداد (828,852) آن ذکور و (458,211) آن اناث، در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی وزارت احیاء و انکشاف دهات؛
- به تعداد (4) شورا بسیج، (4) شورا انتخاب، (78) کلستر ایجاد و (12) پلان انکشافی تکمیل شده است؛
- به طول (98) متر پل، (16) کیلومتر سرک، (24353) متر دیوار محافظوی و (12636) متر کانال و سربند اعمار گردیده است.

ج: معینیت زمینداری:

- توزیع (534) سند ملکیت به باشندگان ساحات غیر پلانی؛
- سروی و تصفیه پروژه های عام المنفعه (بند کجکی، بند کمال خان، بند مچلغو، بند للندر)؛
- تثبیت حق مالکیت مسیر انتقال لین ۲۲۰ کیلو وات، ۵۰۰ کیلو وات و کاسا ۱۰۰۰؛
- تشخیص، سروی و ثبت (265) قطعه زمین معادل (1,144,199) جریب زمین در (28) ولایت.

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر:

- ایجاد شغل برای 43,243 تن در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی ریا ست عمومی اداره امور ریا ست جمهوری و اداره مستقل ارگان های محلی؛
- ایجاد 850 شورای انکشافی محل و 175 شورای انکشافی گذر در چهار ولایت (قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار) توسط اداره مستقل ارگان های محلی.

سکتور مصئونیت اجتماعی:

- پاکسازی در حدود (6,912,761) متر مربع ساحات تمرینات نظامی قوت های خارجی از ماین و مواد منفجره؛
- مستفید شدن (5,698) تن از افراد مختلف جوامع در محدوده های ساحات ماین گذاری شده از برنامه آگاهی از خطرات ماین و مهمات باقی مانده از جنگ؛
- ترتیب مسوده تعدیل قانون حقوق و امتیازات معلولین و قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا مفقودین؛
- تهیه و ترتیب مسوده پلان عمل استراتیژی ملی معلولیت و شریک سازی آن به تمام وزارت ها و ادارات ذیربط؛
- پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین در سطح مرکز و ولایات برای (50335) پنجاه هزار و سه صد و سی و پنج تن؛
- ترتیب پلان عملیاتی برای اعزام 1000 کارگران افغان به امارات متحده عربی بابت سال مالی 1400.

سکتور امنیت:

- امضاء تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت امور خارجه، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره احصائیه ملی و معلومات جهت تسریع روند صدور پاسپورت ماشین خوان، توزیع تذکره الکترونیکی و تثبیت هویت هموطنان ما در کشور ایران؛
- عملی سازی نقشه راه خط آهن مزار – کابل – پیشاور که یاد داشت تفاهم آن میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا گردید؛
- تدوین پالیسی های تامین حقوق و حفاظت از اطفال که به رویت آن پولیس ملی از لیست خاکستری سازمان ملل متحد بیرون گردیده است؛
- تدوین پالیسی آزار و اذیت زنان به منظور رعایت تنوع جنسیتی و رسیدگی آنی به شکایات منسوبین اناث وزارت امور داخله.

چالش های عمده:

- عدم ثبت معلومات دقیق پروژه های انکشافی منجانب ادارات در سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد (CMRS&PMRS)، با توجه به اینکه متکی بر هدایت مصوبه شماره (3) مؤرخ 20/3/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تمامی واحد های بودجه مکلف به ارائه گزارش و درج معلومات در سیستم متذکره گردیده اند؛
- از مجموع (548) پروژه انکشافی طی ربع دوم سال مالی 1400، تعداد (120) پروژه که 22 درصد مجموع پروژه ها را احتوا می نماید در حالات (تدارکات 30، متوقف 36، آغاز نگردیده 54) قرار دارد. دلایل آن قرارذیل می باشد:
 - تاخیر در تصویب بودجه انکشافی؛
 - توقف کار عملی پروژه های انکشافی در اثر وجود نا امنی در ساحات کاری؛
 - عدم تدوین و تکمیل پلان تطبیقی و تدارکاتی پروژه ها از قبل و یا در شروع سال مالی؛
 - مشکلات در طی مراحل و روند پروسه تدارکات؛
 - نرسیدن به موقع اسناد پروژه های انکشافی از واحد های اولی (مرکز) به ولایات؛
 - نبود طرح ها و پلان های احتمالی خطرات و تحلیل بدیل برای پروژه ها.
- وجود مشکلات امنیتی و استملاک زمین در قریه چهار توت ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب (در پروژه سروی، دیزاین و ساختمان بند آبی دهن دره)؛
- کافی نبودن شرکت های وارد کننده سامان آلات لابراتوار در کشور و طولانی شدن پروسه خریداری تجهیزات لابراتوار علوم طبی؛


پیشنهادهای عمده:

- برای دیجیتالی سازی گزارش های مرتبط به پروژه ها و تسهیل حق دسترسی به اطلاعات پیشنهاد می گردد تا ادارات سکتوری گزارش های پیشرفت پروژه های سکتوری خویش را ربع وار شامل سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد نمایند.
- ایجاد کمیته های تکنیکی در سطح واحد های بودجوی به منظور بررسی و جستجو راه حل مناسب جهت تسهیل روند تدارکاتی، تسریع جریان تطبیق پروژه های انکشافی و آغاز کار پروژه های متوقف و آغاز نگردیده؛
- همکاری ارگان های امنیتی و اداره اراضی در تامین امنیت و استملاک اراضی (پروژه سروی، دیزاین و ساختمان بند آبی دهن دره)؛
- زمینه سازی برای جلب مشارکت بیشتر شرکت های وارد کننده سامان آلات لابراتوار طبی توام با ساده سازی پروسه خریداری وسایل متذکره.

شرح گزارش

زیربناء و منابع طبیعی

وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
77,933.00	مجموع بودجه
47,240.01	بودجه اختیاری
30,692.99	بودجه غیر اختیاری
16,384.44	مجموع مصرف
21%	فیصدی مصرف




وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	30
در حال تطبیق	120
آغاز نشده	37
متوقف شده	21
در حال تدارکات	16
گزارش نداده	18
مجموع پروژه ها	242
پیشرفت فیزیکی	17%



چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)					وضعیت پروژه های انکشافی							
فیصدی مصرف	مصرف بودجه	مجموع	غیر اختیاری	اختیاری	اوسط پیشرفت کار	تحت پروسه تدارکاتی	آغاز نگردیده	متوقف	تحت کار	تکمیل	تعداد پروژه	واحد بودجوی
31%	407.24	1,307.96	250.00	1,057.96	14	1	0	0	8	1	10	وزارت معادن و پترولیم
17%	2,837.63	17,125.00	4,469.75	12,655.25	10	1	9	1	19	1	31	وزارت انرژی و آب
0%	0.00	56.00	0.00	56.00	0	0	1	0	0	0	1	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان
15%	1,760.89	12,059.43	10,405.78	1,653.65	27	0	4	6	13	5	28	د افغانستان برشنا شرکت
7%	46.56	623.24	433.24	190.00	10	0	1	1	6	0	8	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
25%	4,742.78	18,633.11	8,583.11	10,050.00	37	14	10	12	32	17	85	وزارت فواید عامه
28%	2,139.34	7,655.00	50.00	7,605.00	با وجود تماس های مکرر گزارش وضعیت پروژه های انکشافی ارائه نگردیده است						18	اداره هوانوردی ملکی
4%	8.60	200.00	0.00	200.00	18	0	0	0	2	0	2	وزارت ترانسپورت
20%	981.72	4,993.45	100.50	4,892.95	30	0	7	0	3	4	14	اداره خط آهن افغانستان

اداره ملی حفاظت محیط زیست	4	0	4	0	0	0	0	31	344.78	15.51	360.30	15.53	4%
وزارت امور شهرسازی	12	0	10	1	1	0	0	20	5,324.43	27.55	5,351.98	1,494.73	28%
شاروالی کابل	8	1	5	0	2	0	0	16	590.00	5,972.55	6,562.55	635.20	10%
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان	11	1	8	0	2	0	0	5	800.00	385.00	1,185.00	417.28	35%
اداره انکشاف زون پایتخت	10	0	10	0	0	0	0	7	1,820.00	0.00	1,820.00	896.96	49%
مجموع	242	30	120	21	37	16	16	17	47,240.01	30,692.99	77,933.00	16,384.44	21%

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

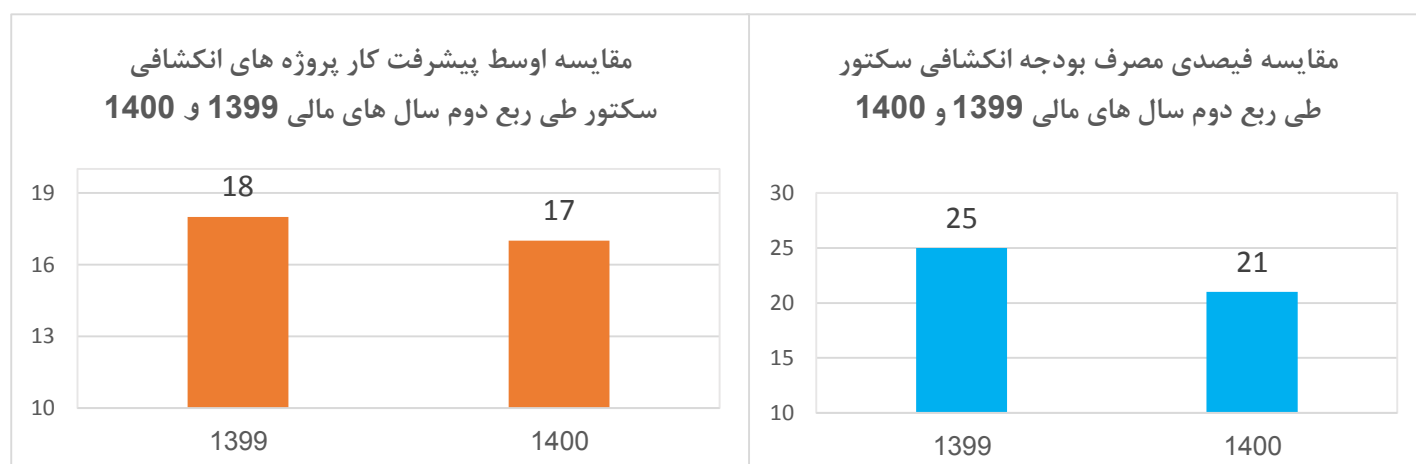

دستاوردهای عمده سکتور:

برشنا شرکت:

- امضا قرارداد پروژه لین انتقال 220 کیلو ولت از غزنی به پکتیا که با تطبیق آن تامین برق مورد نیاز ولایت مرفوع میگردد؛
- وصل برق تورییدی ترکمنستان به سب استیش (220 kv) مزارشریف از طریق لین انتقالی (220 kv) شبرغان_ مزارشریف به طول 114 کیلومتر با نصب پایه ها به بهره برداری سپرده شد که 87 میگاوالت انرژی برق ترکمنستان را جذب و مشکل کمبود برق شهر مزارشریف مرفوع میگردد.

اداره ملی تنظیم امور آب:

- امضا قرارداد مطالعات، دیزاین و ساختمان 42 بند کوچک و بزرگ با تطبیق آن 847.1 میلیون متر مکعب آب ذخیره، 61.1 میگاوالت برق تولید و 211,239 هکتار زمین آبیاری میگردد؛
- امضا قرارداد اعمار بند شاه توت قریه لندر ولایت کابل میان دولت افغانستان و کشور هندوستان به ارزش 286 میلیون دالر با ارتفاع آن 92 متر، ظرفیت ذخیره 146 میلیون متر مکعب آب؛
- آغاز آبیاری بند کمال خان ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز که ظرفیت آبیاری 174,000 هکتار اراضی و تولید برق 9 میگاوالت برق داشته و از آن 49 هزار خانواده بطور مستقیم مستفید میشوند.

وزارت شهرسازی و اراضی:

- ثبت بیش از ۴۸۰ هزار جریب زمین دولتی در ننگرهار؛
- ترتیب پلان های انکشافی برای زمین های دولتی در مرکز و پنج شهر بزرگ.

شهرداری کابل:

- استرداد موازی 100 جریب زمین غصب شده مربوط ساحات سبز در سرک کابل جلال آباد از طرف شهرداری کابل؛
- تطبیق پلان عملیاتی نظم شهری در جاده سلطان محمود غزنوی و در ساحات چهار راهی دوم پروژه احمدشاه بابا مینه؛
- شهرداری کابل با برنامه ریزی های جدید برای تحقق نظم پایدار شهری، تیم های گزیده های سیار را در سطح نواحی 22 گانه ایجاد کرده است؛
- مسوولان شهرداری کابل کتابخانه عامه را در ریاست ناحیه شش به همکاری حاجی سید امیر حمزه منیر، یک تن از کارمندان پیشین وزارت معارف و یکی از باشندگان ناحیه ششم و مسوولان کتابخانه عامه ایجاد کردند؛
- شهرداری کابل سرک و پیاده روهای ساحه باغ قاضی را از وجود موانع و بی نظمی های شهری پاک سازی نمود.

اداره انکشاف زون پایتخت:

- اعمار منازل رهایشی برای مهاجرین و احداث 377 متر سرک جغل فرش کوه قزل؛
- احداث شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب - شهرک مهاجرین مموزی ولایت کابل؛
- اعمار مساجد امیر همزه، نور و بازسازی مسجد امام حسن در ساحه بی بی مهر و الی قلعه موسی؛
- اعمار دیوار استنادی کانکریتی در ساحه بی بی مهر و الی قلعه موسی؛
- احداث 4،177 کیلومتر دیوار احاطوی ترمینل چهار آسیاب.

اداره ملی حفاظت محیط زیست:

- تکمیل کار تعمیر مرکزی اداره ملی حفاظت محیط زیست و چهاردیواری تعمیر اداری ریاست محیط زیست ولایات؛
- نشر پیام های محیط زیستی از طریق رادیو و تلویزیون نشر گردید؛
- برگزاری کمپاین ملی نهال شانی به سطح عموم.

نظارت از پروژه های انکشافی:

ریاست سکتوری صنایع و مواصلات وزارت اقتصاد طی ربع دوم سال مالی 1400 از پروژه های انکشافی 5 ولایت نظارت نموده که شرح آن قرار ذیل ارائه میگردد:

1- پروژه اعمار سرک حلقوی نمبر دوم شهر مزار شریف:

این پروژه به قیمت 1.3 میلیارد افغانی از طرف وزارت محترم فواید عامه با شرکت ساختمانی و سرک سازی ENIZ عقد قرارداد شده است. کار این پروژه به تاریخ 1398/2/26 شروع و به تاریخ 1400/3/27 باید تکمیل میگردد اما کار تطبیق پروژه صرف در حدود 20 فیصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مشخصات پروژه:

- طول سرک: 17.225 کیلومتر
- عرض سرک: 40 متر
- تعداد خط: دو خط
- عرض گلدان: 3 متر به شمول Curb stone دو طرفه
- جویچه دوطرف: 60*60 سانتی متر ضخامت دیوار دوطرفه و کانکریت کف به اندازه 15 سانتی متر
- عرض پیاده رو های دوطرف سرک: 4.6 متر که شامل پرکاری ریگ خشک و موزائیک می باشد.
- Sub base: به اندازه 25 سانتی متر
- Base course: 18 سانتی متر
- Binder course: 7 سانتی متر اسفالت
- Wearing course: 6 سانتی متر اسفالت

کارهای انجام شده در پروژه:

هیئت نظارتی از ساحه کار پروژه به تاریخ 1400/3/27 نظارت نموده اند که با وجود تکمیل شدن میعاد قرارداد در حدود 20 فیصد کار پروژه پیشرفت داشته که شامل هموار کاری ساحه؛ قسمتی از طبقات سرک (شامل binder course, sub base, base course)؛ ساخت پلچک ها؛ جویچه های اطراف سرک میباشد.

مشکلات و نواقص در پروژه:

- عدم ارائه نتایج تست های لابراتواری به هیئت (نظر به راپور قبلی ریاست اقتصاد نتیجه 24 تست منفی میباشد)؛
- کیفیت پائین اسفالت binder course در کار های انجام شده؛
- کمبودی ها در نقشه و BoQs؛
- موجودیت و استفاده از سنگ های لشم بزرگ دانه به تناسب نورم های مشخص شده؛
- کمپکشن ضعیف؛
- نشست ها در قسمت های اسفالت ریزی شده binder course؛
- عقب مانی بیش از حد کار پروژه نظر به میعاد پروژه؛
- قرار گرفتن منهول های فایبر نوری در مسیر سرک؛
- موجودیت تعداد 250 پایه های برق در مسیر سرک؛
- تجمع آب بخاطر در نظر نگرفتن کانال های عبور آب های سطح الارضی؛
- موجودیت سیستم توزیعی شبکه آبرسانی در مسیر سرک؛
- موجودیت خانه ها در مسیر پیاده رو ها؛
- موجودیت کار اضافی (کندنکاری و پرکاری) نظر به لست مشخصات؛
- بطلی بودن کار پروژه باعث ایجاد مشکلات جدی به اهالی دوطرف سرک گردیده است.

مشوره اصلاحی:

- حصول اطمینان از کیفیت کار های انجام شده با استفاده از تست های لابراتواری؛
- منظوری کار های اضافی که در ساحه نیاز است؛
- هماهنگی لازم با شرکت برشنا به منظور انتقال پایه های برق از مسیر سرک؛

- هماهنگی لازم با شرکت افغان تلیکام و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور برطرف نموده مشکل موجودیت منهول ها و کیبل های فایبر نوری؛
- توجه جدی شهرداری بلخ به منظور استملاک خانه های مسیر سرک؛
- در پرکاری ساحات و طبقات سرک از مواد لازم مطابق BoQ استفاده گردد؛
- قبل از کانکریت ریزی و اسفالت؛ مکس دیزاین کانکریت و اسفالت به شرکت داده شود و همچنان از تطبیق آن توسط نظارت کننده گان وزارت فواید عامه نظارت دوامدار صورت گیرد؛
- به منظور تطبیق سریع و کاهش مشکلات ایجاد شده به خانه های اطراف دو طرف سرک باید تعداد ماشینری و پرسونل پروژه ازدیاد یابد.

اهمیت اقتصادی و اجتماعی پروژه:

- پروژه اعمار سرک حلقوی نمبر دوم شهر مزار شریف یکی از پروژه های بزرگ وزارت محترم فواید عامه و به منظور ایجاد سهولت های ترانسپورتی طرح و در حالت تطبیق قرار داشته و حایز اهمیت های ذیل میباشد:
- کاهش ازدحام ترافیکی؛
 - کاهش مصارف کرایه حمل و نقل مسافرین و اموال تجارتي به ولایت های همجوار؛
 - جلوگیری از ضیاع وقت ساکنین ولایت بلخ و ولایت های همجوار؛
 - بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا.



2- پروژه بهره برداری، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف:

این پروژه به منظور تخلیه، بارگیری و انتقال اموال تجارتي از کشورهای آسیای میانه به بندر حیرتان و شهر مزار شریف طرح و به قیمت 18 میلیون دالر آمریکائی با یک کمپنی ازبکستانی قرار داده گردیده است که سیستم های دیجیتالی تنظیم واگون های قطار خط ریل، ترمیم قسمت های از کار افتاده و یا صدمه دیده زیربنای خط آهن که شامل سلیپرها، خط آهن، کرن های تخلیه و بارگیری، جمع آوری خط آهن و ستیشن های موجود توسط کمپنی فوق الذکر تنظیم و تطبیق میگردد.

طبق اظهار امر بهره برداری کار تنظیم امورات فوق الذکر توسط کمپنی به احسن پیشبرده شده و تا هنوز کدام سکتگی در ارائه خدمات رونما نگردیده است.

پیشنهادات:

به اداره محترم ملی خط آهن افغانستان پیشنهاد میگردد در حصه استخدام، آموزش، ارتقا ظرفیت پرسونل مورد نیاز پروژه توجه لازم مبذول داشته و زمینه انتقال ارائه خدمات را به کارمندان داخلی مهیا سازد تا زمینه اشتغال به یک تعداد کثیر از مردم محل مساعد گردد و از طرف دیگر از تادیه مبالغ هنگفت به کمپنی خارجی جلوگیری به عمل آید.

اهمیت اقتصادی و اجتماعی پروژه:

با در نظر داشت معلومات ارائه شده توسط رئیس خط آهن مزار حیرتان این پروژه در کنار اینکه زمینه اشتغال را برای یک تعداد از شهروندان کشور مساعد ساخته است ماهوار در حدود 3 الی 3.5 میلیون دالر عواید از بابت تاسیسات و ارائه خدمات خط آهن مزار حیرتان وارد خزانه دولت میگردد.



معارف





وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
7,480.47	مجموع بودجه
5,282.73	بودجه اختیاری
2,197.73	بودجه غیر اختیاری
1,001.06	مجموع مصرف
13%	فیصدی مصرف

وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	4
در حال تطبیق	49
متوقف شده	6
آغاز نشده	2
در حال تدارکات	5
مجموع پروژه ها	66
پشرفت فزیکي	41%

چگونگی تحقق بودجه انكشافی (میلیون افغانی)					وضعیت پروژه های انكشافی							
فیصدی مصرف	مصرف	مجموع بودجه	غیر اختیاری	اختیاری	اوسط پیشرفت کار	آغاز نشده	متوقف	در حال تدارکات	تحت کار	تکمیل	تعداد پروژه	واحد بودجوی
11%	59.25	555.00	0.00	555.00	10	0	0	1	1	0	2	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
8%	284.68	3,670.49	1,052.53	2,617.97	36	0	2	0	16	1	19	وزارت معارف
21%	440.68	2,143.67	739.39	1,404.28	53	1	1	2	13	0	17	وزارت تحصیلات عالی
35%	113.18	326.03	17.66	308.37	61	0	0	0	8	1	9	واژرت اطلاعات و فرهنگ
20%	97.91	480.20	367.71	112.49	44	1	3	2	4	1	11	اداره تعلیمات تخنیکي و مسلکی
2%	0.76	33.08	20.45	12.63	21	0	0	0	5	0	5	اكادمی علوم افغانستان
2%	4.59	272.00	0.00	272.00	62	0	0	0	2	1	3	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
13%	1,001.06	7,480.47	2,197.73	5,282.73	41%	2	6	5	49	4	66	مجموع

منبع: گزارش واصله از واحدهای بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

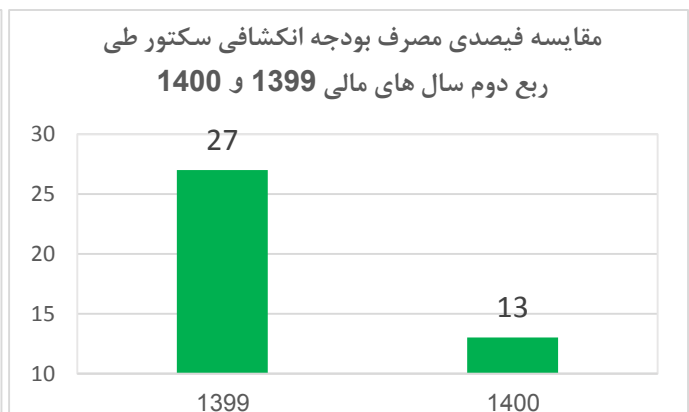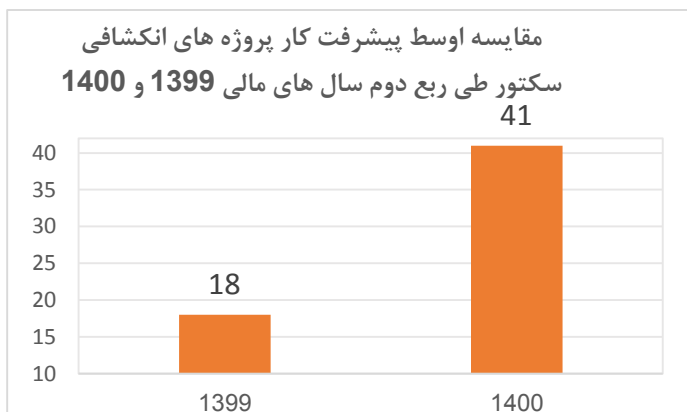

دستاورد های عمده سکتور:

- جذب تعداد 970,498 شاگرد در برنامه تعلیمات عمومی که از جمله 503,198 ذکور و 367,300 اناث میباشد؛
- جذب تعداد 48,969 شاگرد در برنامه تعلیمات اسلامی که از جمله 32,910 ذکور و 16,059 اناث میباشد؛
- به تعداد 5,212 محصل در برنامه تربیه معلم جذب گردیده که از جمله 2,353 ذکور و 2,859 اناث میباشد؛
- به تعداد 76,405 شاگرد در برنامه سواد آموزی جذب گردیده که از جمله 41,492 ذکور و 34,913 اناث میباشد؛
- آموزش تعداد 927 تن معلم و کارمندان مرکز و ولایات در بخش طرز العمل ارزیابی ارتقای ظرفیت؛
- توزیع مجوز برای تعداد 150 باب مکتب خصوصی جدید؛
- استخدام تعداد (9652) تن معلم و کارمند در مرکز و ولایات؛
- به تعداد 17 ولایت شامل سیستم شهادتنامه های الکترونیکی (CMIS) شده اند که بادر نظرداشت پیشرفت های فوق سیستم متذکره به سطح تمام کشور مورد تطبیق قرار گرفته است؛
- انتقال 5,917 قلم آثار مختلف النوع باستانی و با ارزش از مس عینک به مرکز؛
- استحکام بندی دو مغاره و کشف یک تعداد آثار منقول شامل پارچه های ظروف سفالی، پارچه های استخوان و آثار غیر منقول آن شامل چندین ساختمان سنگی بقایای اندک از دیوار سنگ کاری دهلیز راه زینه در ساحه باستانی بالاحصار کابل؛
- انتقال ۶۸ قلم آثار مختلف النوع به موزیم ملی بعد از پروسه پاک کاری و اسناد سازی؛
- تسلیم دهی 33 قلم آثار باستانی از جانب اداره مبارز با قاچاق ایالات نیویارک، ایالات متحده امریکا به سفارت افغانستان مقیم واشنگتن؛
- برای اولین بار پوهنتون کاربردی تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد گردیده که در رشته های زراعت، برق و ساختمان به فعالیت آغاز گردیده؛
- افزایش تعداد مراکز آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی از ۴۲ باب به ۳۸۲ باب؛
- افزایش تعداد شاگردان و محصلین تعلیمات تخنیکی و مسلکی از ۴۲۰۰۰ به ۶۲۰۰۰ و همچنان تعداد استادان مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی از 2500 تن به 4843 تن افزایش یافته است؛
- ایجاد سیستم تدریس آنلاین که در نتیجه نصاب در سی رشته های تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سیستم مذکور و حدود ۷۰۰۰ ویدیو درسی ثبت گردیده؛
- ایجاد 12 مرکز PDC در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و همچنان ایجاد کمپیوتر لب در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی (نورستان، تخنیکی غزنی، پنجشیر، نیمروز و ارزگان)؛
- ایجاد صنوف آنلاین برای پوهنتون های مرکز و ولایات (کابل، طبی کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولی تخنیک کابل، کندهار، هرات ننگرهار، بلخ و شیخ زاید خوست)؛
- تطبیق پروژه ارایه خدمات از طریق کیبل فایبر نوری برای 35 کمپس مؤسسه تحصیلی و تهیه انترنت و ایمکس برای مؤسسات تحصیلات عالی (بادغیس، سرپل، پنجشیر، نیمروز، زابل، شفاخانه تدریسی البیرونی، فاریاب، ارزگان، دایکندی، فراه و غور)؛
- شبکه سازی برای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی (سرپل، بادغیس، فاریاب و لوگر).




وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
مجموع بودجه	13,306.25
بودجه اختیاری	4,395.18
بودجه غیر اختیاری	8,911.07
مجموع مصرف	5,245.95
فیصدی مصرف	39%



وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	2
در حال تطبیق	34
متوقف شده	5
آغاز نشده	0
در حال تدارکات	3
مجموع پروژه ها	44
پیشرفت فیزیکی	36%

چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)					وضعیت پروژه های انکشافی							
فیصدی مصرف	مصرف	مجموع بودجه	غیر اختیاری	اختیاری	اوسط پیشرفت کار	آغاز نشده	متوقف	تحت روند تدارکاتی	تحت کار	تکمیل	تعداد پروژه	اداره
39%	5,245.95	13,306.25	8,911.07	4,395.18	36%	0	5	3	34	2	44	وزارت صحت عامه

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

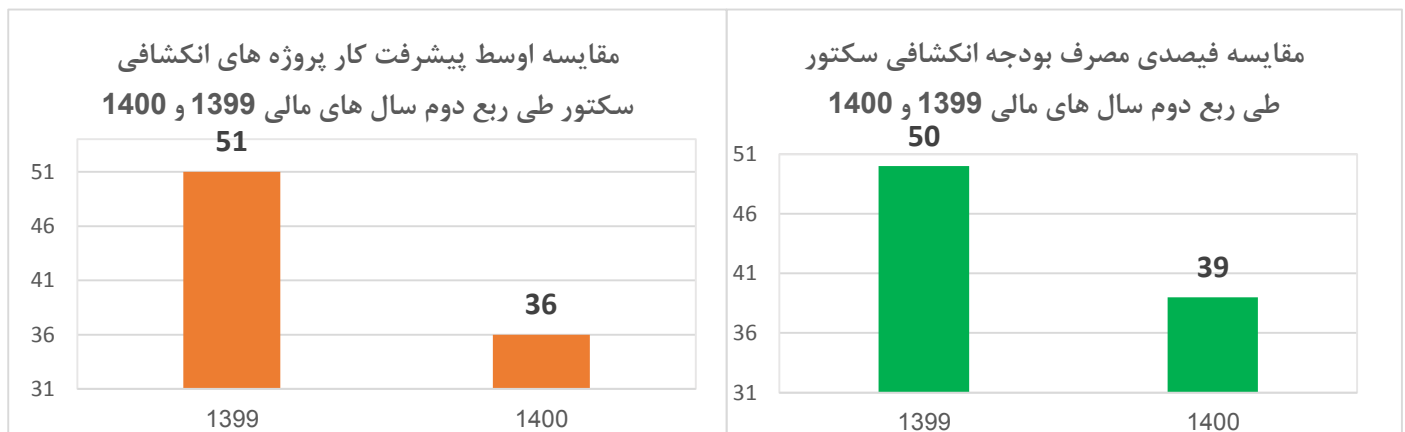

دستاوردهای عمده سکتور:

- ایجاد شغل موقت در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی سکتور صحت برای تعداد (18,659) تن ذکور و (6,035) تن اناث؛
- ترتیب پالیسی ملی صحت برای سال های 2021-2030 و همچنان احذ و تسلیمی زمین برای اعمار شفاخانه 200 بستر امراض سرطان در ولایت کابل؛
- نظارت از شفاخانه های ملی در کابل و شریک ساختن نتایج و دریافت های ماموریت های نظارتی با رهبری وزارت صحت عامه؛
- نظارت از شفاخانه های کووید 19 یا کرونا در 3 ولایت کشور (هرات، قندهار و ننگرهار)؛
- بازدید مستقیم و ارزیابی عرضه خدمات کوید 19 در 31 ولایت مطابق به چک لست شورای طبی افغانستان؛

- به تعداد 48 بازدید نظارتی و کنترل کیفی از لابراتوار های حوزوی و ولایتی تحت پروژه گلوبل فند انجام و دریافت های آن با ادارات ذیربط شریک گردیده است؛
- عرضه خدمات صحتی برای 7748 تن مریضان سرطانی که از این جمله 5528 تن خدمات سراپا، و 2220 تن خدمات داخل بستر را دریافت نموده اند. ضمناً به تعداد 530 تن از خدمات جراحی مستفید گردیده اند؛
- فعال نمودن و به بهره برداری سپردن بخش سراپا جراحی قلبی در پولی کلینیک شفاخانه صحت طفل اندراگانندی؛
- ایجاد مراکز پی سی آر جهت تشخیص کووید 19 در ولایات نورستان، کندز، تورغندی هرات، بندر آقینه ولایت فاریاب، کندهار، پروان و پنجشیر با همکاری سازمان صحتی جهان؛
- فعال نمودن ساحه قرنطین به ظرفیت 50 بستر در محبس مرکزی پلچرخ و همچنان افتتاح و تجهیز شفاخانه صد بستر قصبه جهت تداوی مریضان مصاب به کرونا؛
- فعال نمودن سیستم تولید اکسیجن در شفاخانه های صحت طفل، وزیر اکبرخان، اندونیزیا، جمهوریت و اندراگانندی و همچنان شفاخانه های حوزوی ولایات جهت تداوی مریضان کووید 19؛
- اعمار شفاخانه های 400 بستر کمپلکس در ولایت کابل و 100 بستر در ولایت پکتیا جهت تداوی و درمان بیماری کرونا؛
- طرح اجازه نامه تشخیص و عقد قرارداد با 13 شفاخانه های خصوصی غرض تشخیص و درمان بیماری کرونا (کوید 19).

تاثیرات ویروس کرونا (کوید 19) بالای سکتوری صحت و زندگی مردم:

با وجودیکه ویروس کرونا یک مرض جهانی بوده که در کشور های مختلف علایم مثبت و منفی به جا گذاشته از جمله افغانستان نیز خسارات مالی و جانی را از اثر شیوع این ویروس چرخه های اقتصادی به رکود مواجه شده نظام اقتصادی کشور برهم خورده و میزان بیکاری بیشتر گردیده، تاثیرات منفی و سوء را در جهت ارائه و عرضه خدمات صحتی که همه کارکنان صحتی با کمبود وسایل و تجهیزات مواجه بوده و نتوانستند بخوبی در برابر این ویروس مبارزه نمایند، چالش جدی را در سکتور صحت بوجود آورد.

سکتور صحت که با چالش بزرگ چون نبود پرسونل صحتی مجرب، نبود ادویه جات با کیفیت، نبود وسایل و تجهیزات لابراتواری، کمبود پرسونل صحتی مواجه بوده و هنوز هم نتوانسته است رضایت هموطنان را حاصل نماید.

در اواخر سال 2019 با ظهور ویروس مهلک و واگیر (کرونا) که همه جهان هستی را به چالش و بحران اقتصادی و مالی مواجه ساخته است و تمام کشور های جهان از آسیب و گزند این ویروس با چالش های بزرگ مالی مواجه شده اند که باعث زیان مالی میلیارد ها دالر شده و بازار های سهام دولت ها را به کاهش ارزش و بهای سهام مواجه ساخته است و کشور های در حال توسعه که هنوز جدیداً پا به عرصه توسعه یافتگی نهاده اند هنوز با فقر، بیکاری، نبود عرضه خدمات صحتی معیاری دست و پنجه نرم میکنند. این ویروس مهلک ضربه محکم به افراد فقیر جامعه و حتی باعث سیر نزولی رشد اقتصادی نیز گردید است.

ویروس کرونا بالای رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیرات زیادی وارد نموده است:

- سبب توقف کارخانه جات تولیدی در سکتور خصوصی و دولتی گردیده است؛

- میزان بیکاری را در سکتور های مختلف افزایش داده است.

وزارت صحت عامه طرح آغاز تشخیص و درمان ویروس یا بیماری کرونا را پس از منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به شفاخانه های خصوصی مورد تطبیق قرار داده تا با سکتور دولتی (شفاخانه های دولتی) دوشا دوش در مقابل این ویروس مهلک مباره همه جانبه نمایند.

زراعت و انکشاف دهات





وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
35,268.11	مجموع بودجه
11,896.33	بودجه اختیاری
23,371.77	بودجه غیر اختیاری
8,342.87	مجموع مصرف
24%	فیصدی مصرف



وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	2
در حال تطبیق	43
آغاز نشده	0
در حال تدارکات	3
متوقف	2
مجموع پروژه ها	50
پیشرفت فیزیکی	18%

چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیارد افغانی)						وضعیت پروژه های انکشافی						
فیصدی مصرف	مصرف بودجه	مجموع	غیر اختیاری	اختیاری	فیصدی پیشرفت کار	آغاز نگردیده	متوقف	تحت پروسه تدارکاتی	تحت کار	تکمیل	تعداد پروژه	واحد بودجوی
15%	1,836.01	12,325.31	6,169.37	6,155.93	20	0	0	3	27	2	32	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
29%	6,387.47	22,345.80	17,085.40	5,260.40	28	0	2	0	11	0	13	وزارت احیاء و انکشاف دهات
20%	119.39	597.00	117.00	480.00	6	0	0	0	5	0	5	اداره مستقل اراضی افغانستان
24%	8,342.87	35,268.11	23,371.77	11,896.33	18%	0	2	3	43	2	50	مجموع

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

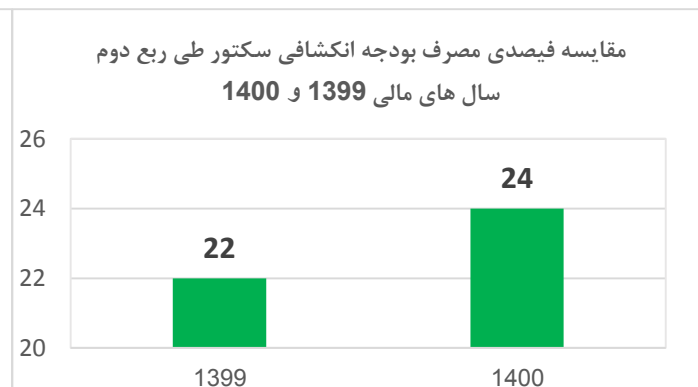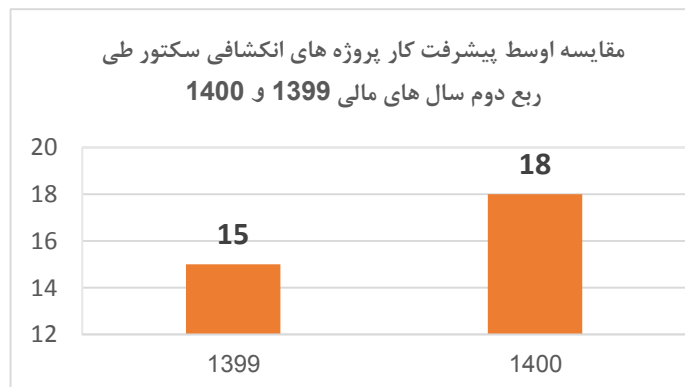

دستاوردهای عمده سکتور:

الف: وزارت زراعت، آبیاری و مالداري:

- 410 تجربه تحقیقاتی بمنظور معرفی تکنالوژی های جدید و افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی انجام گردیده است.
- بمنظور تقویت سیستم آبیاری 150 هکتار ساحات جدید آبریزه ها ایجاد گردید؛
- جهت افزایش محصولات باغداری، باغات متراکم در ۸ ولایت احداث گردیده است؛
- بمنظور بلند بردن ارزش، کمیت و کیفیت میوه جات در ساحه 700 هکتار زمین باغات، احداث گردیده؛
- غرض فروش، نگهداری و ترویج گل به تعداد ۱۲۰۰ باب گل خانه بزرگ و کوچک ایجاد گردیده؛
- خریداری و توزیع (2300) بسته زراعتی شامل؛ چسپ حشره کش، کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده و همچنان خریداری و توزیع (13500) بسته باغداری از قبیل اسپری پمپ، قیچی شاخه بری، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل برای باغداران ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس)؛
- حفظ و مراقبت 2508 هکتار ساحه به بطور متواتر؛
- احداث 3262 باغچه های خانگی با نصب سیستم آبیاری قطره ئی پروژه در 8 ولایت.

ب: وزارت احیاء و انکشاف دهات:

- ایجاد شغل دایمی و موقت برای تعداد (1,287,063) تن که از جمله تعداد (828,852) آن ذکور و (458,211) آن اناث، در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی وزارت احیاء و انکشاف دهات؛
- به تعداد (4) شورا بسیج، (4) شورا انتخاب، (78) کلستر ایجاد و (12) پلان انکشافی را تکمیل شده است؛
- اینوزارت توانسته است به طول (98) متر پل، (16) کیلومتر سرک، (24353) متر دیوار محافظوی و (12636) متر کانال و سربند را اعمار نماید.

ج: معینیت زمینداری:

- توزیع (534) سند ملکیت به باشندگان ساحات غیر پلانی؛
- سروی و تصفیه پروژه های عام المنفعه (بند کجکی، بند کمال خان، بند مچلغو، بند للندر)؛
- تثبیت حق مالکیت مسیر انتقال لین ۲۲۰ کیلو وات، ۵۰۰ کیلو وات و کاسا ۱۰۰۰؛
- تثبیت حق مالکیت سرک کابل لوگر، فاز اول حلقوی سرک کابل، سرک دوشی بامیان و سرک سپری سرخرو؛
- تشخیص، سروی و ثبت (265) قطعه زمین معادل (199، 144، 1) جریب زمین در (28) ولایت.

انطباق دهی شاخص های اهداف انکشاف پایدار (SDGs) با دست آورد های برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره	شاخص های SDG	نام برنامه	اقدامات وزارت
1	6.1، دسترسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت قابل استطاعت.	2- برنامه ملی آب رسانی و حفظ الصحه محیطی	برنامه ملی آب رسانی و حفظ الصحه محیطی طی ربع دوم سال مالی 1400 توانسته (45) باب شبکه آبرسانی، (62) حلقه چاه با نصب پمپ دستی و سولر، و (12) باب ذخیره آب و (0) متر کانال اعمار و ترمیم نماید.

انطباق دهی شاخص های ANPDF2 با اهداف و دست آورد های پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره	شاخص ANPDF2	نام برنامه	اقدامات وزارت
1	در چهار سال آینده مجموعاً 12000 شورای محلی را به عرضه خدمات تحت پوشش قرار خواهد داد.	برنامه ملی میثاق شهروندی.	توسط برنامه ملی میثاق شهروندی طی ربع دوم سال 1400 به تعداد (0) شورا های انکشافی را بسیج، (3) شورا را انتخاب، (26) پلان های انکشافی را تکمیل و به تعداد (17) کلاستر را ایجاد نموده است برنامه ملی میثاق شهروندی، زیر چتر انکشاف زیربنا در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به پیش میرود.

حکومتداری





وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
مجموع بودجه	13,479.12
بودجه اختیاری	5,553.58
بودجه غیر اختیاری	7,925.54
مجموع مصرف	2,345.84
فیصدی مصرف	17%

وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	2
در حال تطبیق	32
متوقف شده	0
آغاز نشده	1
در حال تدارکات	2
گزارش نداده	2
مجموع پروژه ها	39
پیشرفت فیزیکی	19%

چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)						وضعیت پروژه های انکشافی							
فیصدی مصرف	مصرف بودجه	مجموع	غیر اختیاری	اختیاری	فیصدی پیشرفت کار	گزارش نداده	آغاز نشده	متوقف	تحت روند تدارکاتی	تحت کار	تکمیل	تعداد پروژه	واحد بودجی
0%	0.00	30.00	0.00	30.00	0%	0	0	0	0	1	0	1	ریاست عمومی دار الانشای ولسی جرگه
24%	1,068.91	4,448.63	105.73	4,342.90	10%	0	0	0	0	12	0	12	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
15%	3.34	22.00	0.00	22.00	45%	0	0	0	0	1	0	1	دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی
25%	17.27	68.4	0.00	68.4	25%	0	0	0	0	4	0	4	وزارت عدلیه
12%	889.86	7,492.21	6,807.21	685.00	13%	2	0	0	0	3	0	5	ریاست ارگان های محلی
34%	350.33	1,036.00	1,000.00	36.00	16%	0	0	0	0	3	1	4	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
0%	0.00	0.39	0.00	0.39	0%	0	0	0	2	0	0	2	کمیسیون مستقل انتخابات
0%	0.00	11.61	0.00	11.61	60%	0	0	0	0	1	1	2	ستره محکمه
0%	0.00	30.00	0.00	30.00	25%	0	0	0	0	1	0	1	لوی سارنوالی
0%	0.00	5.5	0.00	5.5	0%	0	1	0	0	0	0	1	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
5%	16.13	334.38	12.60	321.78	20%	0	0	0	0	6	0	6	وزارت ارشاد، حج و اوقاف
17%	2,345.84	13,479.12	7,925.54	5,553.58	19%	2	1	0	2	32	2	39	مجموع

منبع: گزارش واسله از واحد های بودجی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

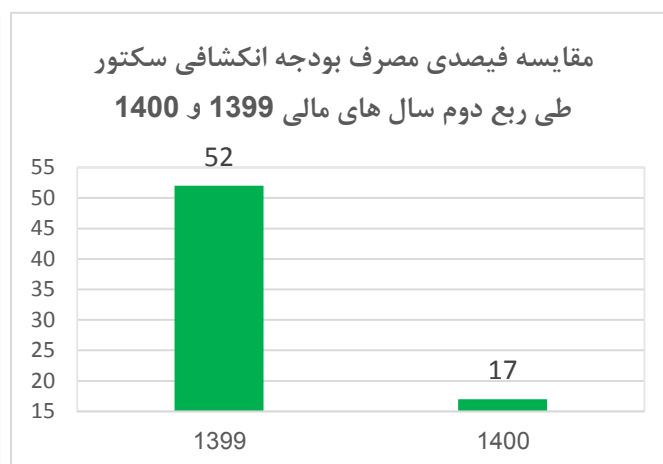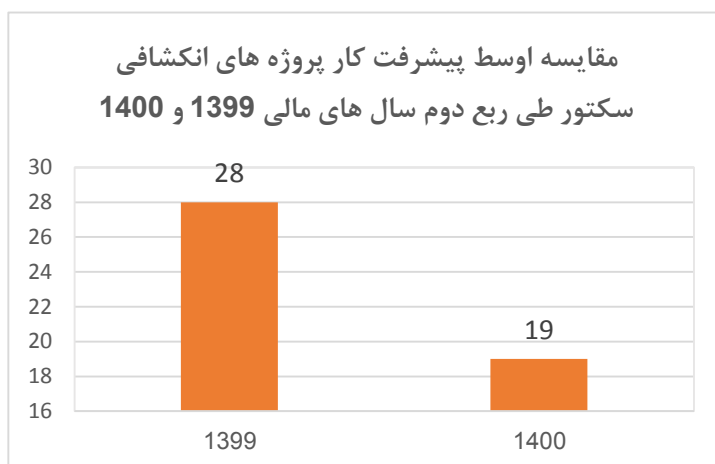

دستاورد های عمده سکتور

- ایجاد شغل برای 43,243 تن در نتیجه تطبیق پروژه های انکشافی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و اداره مستقل ارگان های محلی؛
- ایجاد 850 شورای انکشافی محل و 175 شورای انکشافی گذر در چهار ولایت (قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار) توسط اداره مستقل ارگان های محلی.

تحلیل بودجه انکشافی سکتوری و موثریت آن

در وضعیت کنونی کشور، مصرف موثر بودجه میتواند یکی از انتخاب خوب برای کاهش مشکلات اقتصادی- اجتماعی به ویژه ایجاد کار و کاهش فقر باشد. بطور معمول دولت ها با اختصاص منابع مالی و تطبیق پروژه های انکشافی و نیز مصرف موثر منابع راه را برای تغییر وضعیت و رسیدن به اهداف ملی پهن میکنند. از اینکه مصرف ادارات سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در ربع دوم سال مالی 1400 با وجود مرحله سوم شیوه ویروس کرونا (2345.67) میلیون افغانی که حدود (17) فیصد گزارش شده است این پیام را می رساند که این سکتور توانسته طی ربع مذکور به اهداف خویش برسد.

قابل ذکر است که پروژه ها و برنامه های این سکتور با اولویت های (1- برنامه میثاق شهروندی 2- برنامه حکومتداری موثر 3 - برنامه عدالت برای همه) چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و هدف شانزدهم و شاخص ها و تارگیت های (16.5.3، 16.2.2، 16.3.3 و 16.5.1) اهداف انکشاف پایدار همسویی دارند.

اقتصاد



وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
مجموع بودجه	14,438.89
بودجه اختیاری	8,075.08
بودجه غیر اختیاری	6,363.81
مجموع مصرف	3,546.02
فیصدی مصرف	25%




وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	0
در حال تطبیق	45
آغاز نشده	1
در حال تدارکات	0
متوقف	0
مجموع پروژه ها	46
پیشرفت فیزیکی	21%




چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)						وضعیت پروژه های انکشافی						
فیصدی مصرف	مصرف	مجموع	غیر اختیاری	اختیاری	اوسط پیشرفت کار	آغاز نگردیده	متوقف	پروژه تدارکاتی	تحت کار	تکمیل	پروژه	واحد بودجوی
31%	2,526.18	8,032.93	3,230.61	4,802.32	31%		0	0	18	0	18	وزارت مالیه
8%	61.75	755.00	0.00	755.00	8%	1	0	0	4	0	5	وزارت صنعت و تجارت
44%	133.53	304	180.00	124	44%		0	0	5	0	5	وزارت اقتصاد
0%	0.00	161.00	0.00	161.00	0%	0	0	0	7	0	7	اداره ملی ستنرد افغانستان
5%	14	258.09	182.15	75.94	5%	0	0	0	4	0	4	اداره عالی بررسی
12%	501.64	4,309.81	2,153.00	2,156.81	12%	0	0	0	6	0	6	اداره ملی احصائیه و معلومات
50%	308.92	618.05	618.05	0.00	50%	0	0	0	1	0	1	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان
25%	3,546.02	14,438.89	6,363.81	8,075.08	21%	1	0	0	45	0	46	مجموع

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

مقایسه اوسط پیشرفت کار پروژه های انکشافی سکتور
طی ربع دوم سال های مالی 1399 و 1400

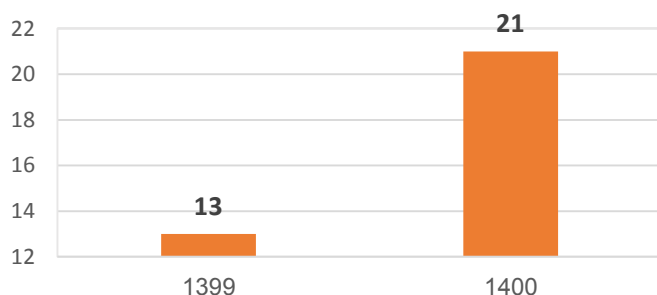

مقایسه فیصدی مصرف بودجه انکشافی سکتور طی
ربع دوم سال های مالی 1399 و 1400

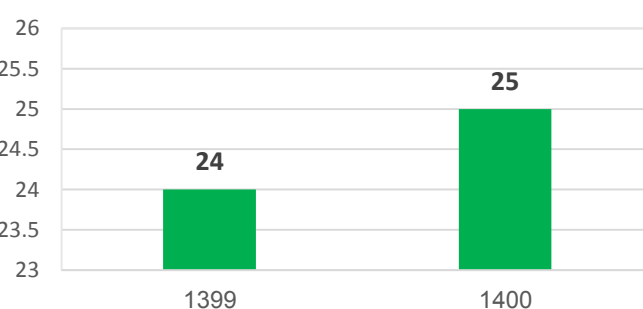

تطابق پروژه های سکتور اقتصاد با اهداف ASDGs و ANPDF2(NPP-PSD):

طوری که دیده میشود از مجموع 45 پروژه انکشافی 7 واحد بودجی مربوط سکتور اقتصاد در حدود 35 پروژه آن ماهیت فیزیکی نداشته ولی با آنها با اهداف انکشاف پایدار (ASDGs) و برنامه ملی دارای اولویت سکتور خصوصی ANPDF2(NPP-PSD) مطابقت دارند که ذیلاً به آن اشاره میگردد:

- پروژه دهلیز های هوایی برای توازن تجارت، عصری سازی گمرکات و بانک های دولتی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان، برنامه دارای اولویت ملی برای توانمندی زنان که مربوط وزارت مالیه میشود در راستای بهبود سیستم های جمع اوری عواید، موثر عملیاتی بانکهای دولتی، ازدیاد دسترسی مشتریان از طریق افزایش خدمات آنها و بهبود ازدیاد میزان عواید بانکهای دولتی فعالیت مینماید، که در دستیابی به اهداف 5، 8 و 9 سند ASDGs کمک فوق العاده مینماید.
- پروژه حمایت از محیط تجارت (کار و بار)، پیشرفت ولایتی، ایجاد پارکهای صنعتی و تجارت بین المللی پروژه های وزارت صنعت و تجارت و تجارت بین المللی اند که میتواند در دستیابی اهداف 5، 8 و 9 ASDGs که همانا افزایش تولیدات، صادرات و تقویت کاری خانم ها است ممد واقع میگردد.
- پروژه انکشافی برای مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه که در تطبیق آنده پروژه های بزرگ ملی که سکتور عامه به تنهایی قادر به سرمایه گذاری و تطبیق آنها نبوده توسط برنامه متذکره این پروژه ها را در مشارکت با سکتور خصوصی عملی میسازد. این پروژه در تطابق به (NPP-PSD) برنامه ملی دارای اولویت انکشاف سکتور خصوصی و تارگیت 17 هدف هفدهم ASDGs (تقویه و حمایت سکتور خصوصی) میباشد.
- مدیریت پروژه های کوچک سرحدی با تاثیرات بلند که برای ایجاد فرصت های کاری و ایجاد زمینه آموزش و ارائه خدمات صحی در نقاط دور افتاده و غیر انکشاف یافته را مساعد میسازد با اهداف چند گانه SDG در تطابق میباشد.
- پروژه دسترسی به وجوه مالی که هدف توسعهی پروژه متذکره ایجاد ظرفیت نهادی جهت بهبود دسترسی به اعتبارات شرکت های کوچک، کوچک و متوسط است که این پروژه با تکنالوژی های جدید به متشبین ومولدين معرفي خواهد شد وهمچنان هدف مهم ان مبارزه با پول شوئی میباشد و این پروژه با هدف هشتم SDG در تطابق میباشد.
- پروژه های انکشافی ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت اقتصاد و برنامه اشتغال زائی در قسمت توانمند سازی جندر سهم بارز داشته و هم چنان ما را به اهداف شماره 1 و 5 اهداف SDG کمک مینماید.

تحولات سکتور پولی

یکی از اهداف اساسی این سکتور کنترل نمودن سطح عمومی قیمت ها یا نرخ تورم سالیانه میباشد. نرخ تورم در ده ماه اول سال مالی 1399 به اندازه 5.58 درصد رسیده است. حالانکه در یک مشابه گذشته این رقم به 2.37 درصد ثبت گردیده است. نرخ تورم در این جریان بلندترین نرخ را در برج حمل سال 1399 داشته که به 8.67 درصد ثبت شده است و کمترین آن به 3.54 رسیده است. هرچند غرض مهار نمودن تورم و ثبات واحد افغانی، بانک مرکزی افغانستان توانسته است که به مبلغ 2.09 میلیارد دالر را در بازار های پولی مزایده و ضمناً به ارزش 195 میلیارد افغانی را اوراق بهادار به فروش برساند.

ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال مالی 1399 به تناسب سالهای قبل افزایش نموده است چنانچه که در ابتدای سال مالی 1399 مقدار آن به 7 میلیارد و 994 میلیون دالر میرسید حالانکه در اخیر سال یاد شده این مبلغ به 8 میلیارد و 118 میلیون دالر رسیده است که به اندازه 124 میلیون دالر افزایش خالص را نشان میدهد.

در بخش بانک ها، در سال مالی 1399 به تعداد 12 بانک تجارتي خصوصی دولتي با 413 نمایندگی ولایتی آن در سراسر افغانستان بوده که مجموع دارایی های این سکتور به اندازه 309,019 میلیون افغانی و مجموع امانات (سپرده ها) این سکتور به مقدار

26,0579 میلیون افغانی و در ضمن مجموع قروض این سکتور 39,258 میلیون افغانی و مفاد این سکتور بانکی در سال مالی 1399 به 1,654 میلیون افغانی ثبت گردیده که سرانجام مجموع سپرده گذاران یا مشتریان ثبت شده در این سال به 4.271 میلیون تن میرسند.

در نهایت پیرامون ثبات نرخ مبادله باید گفت که در سال مالی 1399 ثبات پولی افغانی نسبت به سال مالی 1398 بهتر بوده است که نوسات کمتری داشته است که میانگین نرخ تورم در سه ماه اول سال مالی 1400 به 77.5 افغانی در برابر یک دالر امریکایی ثبت شده است.

تحولات سکتور تجارت خارجی

به علت اینکه بیشترین صادرات تولیدات افغانی از طریق دهلیز های هوایی به کشور های مختلف جهان مانند چین، کشور های عربی، هندوستان و کشور های اروپائی صورت میگیرد، بناءً با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های قرنطین در کشور های متذکره، مشکلات مسدود شدن بنادر ترانزیتی با پاکستان، میزان صادرات در سال 1399 کاهش یافته است، طوریکه اموال صادر شده طی سال 1399 حدود مبلغ (776.73) میلیون دالر بوده که به مقایسه سال 1398 به میزان مبلغ (99) میلیون دالر یا 11 درصد کاهش را نشان میدهد.

همچنان طی سال 1399 حاوی مبلغ (6.537) میلیارد دالر واردات امتعه به داخل کشور صورت گرفته که در تناسب به مدت مشابه سال 1398 حدود (0.24) میلیون دالر یا 3 درصد کاهش نموده است. که دلایل کاهش نسبت به سال گذشته، مشکلات عاید از درک شیوع ویروس کرونا در جهان میباشد.

مصنویت اجتماعی



وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
4,162.25	مجموع بودجه
1,227.09	بودجه اختیاری
2,935.16	بودجه غیر اختیاری
228.34	مجموع مصرف
5%	فیصدی مصرف




وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عمده	عناوین
3	تکمیل شده
16	در حال تطبیق
2	متوقف شده
13	آغاز نشده
0	تحت پروسه تدارکاتی
34	مجموع پروژه ها
12%	پیشرفت فیزیکی



چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)						وضعیت پروژه های انکشافی						
فیصدی مصرف	مصرف بودجه	مجموع	غیر اختیاری	اختیاری	اوسط پیشرفت کار	آغاز نگردیده	متوقف	تحت پروسه تدارکاتی	تحت کار	تکمیل	پروژه	واحد بودجی
1%	9.6	660.00	60.00	600.00	4%	5	0	0	1	0	6	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
7%	6.47	90.39	0.00	90.39	3%	3	0	0	1	0	4	وزارت شهدا و معلولین
6%	158.52	2,779.20	2,702.00	77.2	2%	5	0	0	3	0	8	وزارت امور زنان
16%	6.44	40.00	0.00	40.00	22%	0	0	0	3	0	3	وزارت امور سرحدات و قبائیل
8%	39.27	490.00	90.00	400.00	32%	0	1	0	4	2	7	وزارت کار و امور اجتماعی
1%	0.28	19.5	0.00	19.5	0%	0	1	0	2	1	4	ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها
9%	7.76	83.16	83.16	0.00	20%	0	0	0	2	0	2	اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث
5%	228.34	4,162.25	2,935.16	1,227.09	12%	13	2	0	16	3	34	مجموع

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

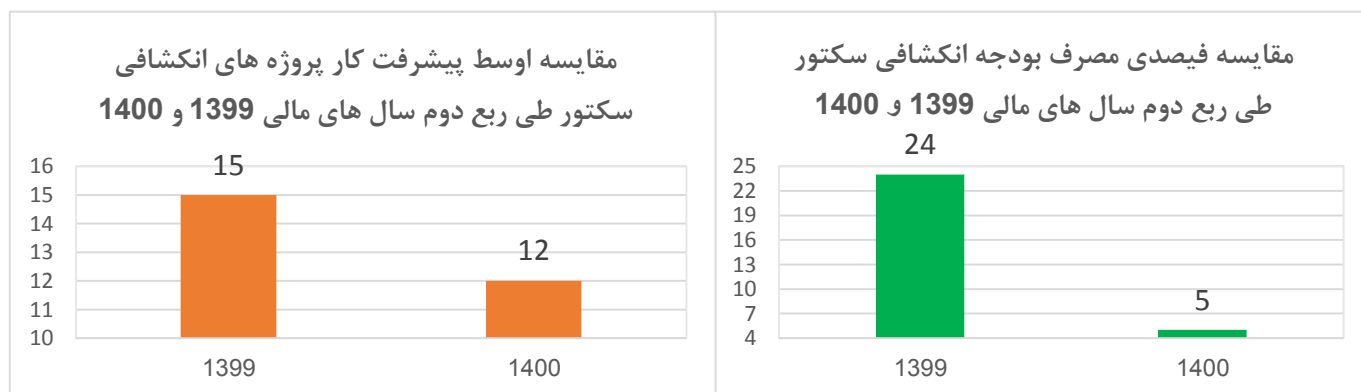

دستاورد های عمده سکتور:

- پاکسازی در حدود (6,912,761) متر مربع ساحات تمرینات نظامی قوت های خارجی از ماین و مواد منفجره؛
- مستفید شدن (5,698) تن از افراد مختلف جوامع در محدوده های ساحات ماین گذاری شده از برنامه آگاهی از خطرات ماین و مهمات باقی مانده از جنگ؛
- کشف و تخریب 8 حلقه ماین ضد پرسونل، 3 حلقه ماین ضد تانک و 45 عدد مهمات مختلف النوع؛
- تهیه و ترتیب مسوده نهایی استراتیژی ملی معلولیت؛
- ایجاد میکانیزم جهت تشخیص، کاریابی و ارتقای ظرفیت ورثه شهدا و معلولین؛
- ایجاد کمیته حل اختلافات ناشی از کار؛
- ترتیب مسوده تعدیل قانون حقوق و امتیازات معلولین و قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا مفقودین؛
- تهیه و ترتیب مسوده پلان عمل استراتیژی ملی معلولیت و شریک سازی آن به تمام وزارت ها و ادارات ذیربط؛
- ایجاد کمیته تخنیکی تطبیق تعهدات کنفرانس جینوا؛
- توزیع 29 عراده ویلچر برقی برای معلولین نیازمند؛
- تهیه و ترتیب طرزالعمل کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال؛
- پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین در سطح مرکز و ولایات برای (50335) پنجاه هزار و سه صد و سی و پنج تن؛
- انکشاف 12 نسخه استاندارد ملی مهارت های شغلی با حمایت مالی موسسه DRC تحت پروژه TAALIM؛
- ترجمه نصاب آموزشی میخانیک وسایط نقلیه - سویه اول و دوم از لسان دری به پشتو؛
- انکشاف فورمه های تضمین کیفیت برای ارزیابی فارغان مراکز آموزش های فنی و حرفوی؛
- تحت حمایت و مراقبت قراردادن 189 طفل در معرض خطر، 15 طفل داعش و 20 طفل معلول و ادغام 124 طفل از طریق مرکز حمایتی اطفال در معرض خطر کابل، بلخ، بامیان و ننگرهار؛
- ترتیب طرح جدید برنامه ملی مهاجرت های مدیریت شده کاری و ارسال آن به ریاست جمهوری بخاطر منظوری؛
- ایجاد هماهنگی از طریق تدویر مجالس با ریاست های داخلی و وزارت محترم خارجه به منظور تسریع پروسه عقد تفاهم نامه های اعزام کارگران به خارج (کشور شاهی عربستان سعودی و قطر)؛
- ترتیب پلان عملیاتی برای اعزام 1000 کارگران افغان به امارات متحده عربی بابت سال مالی 1400؛
- بلند بردن سطح عواید دولت و تطبیق مواد قانون کار به اساس توزیع جواز کار؛
- امضاء تفاهمنامه همکاری برای رسیدگی به بیجاشده ها و برگشت کنندگان به ارزش نزدیک به 700 هزار یورو با موسسه (AWARD) به هدف همکاری و ایجاد هماهنگی در اجرایی کردن پروژه ابتکار برای توسعه پایدار و ادغام مجدد عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و افراد آسیب پذیر در جامعه در ولایات کابل و ننگرهار با وزارت امور مهاجرین همکاری می نماید.

تحلیل پروژه های انکشافی نظر به دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف و اهداف انکشاف پایدار افغانستان:

پروژه های انکشافی این سکتور با دو برنامه ملی دارای اولیت چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF2) (ادغام مجدد و توانمند سازی اقتصادی زنان) که هدف برنامه های فوق بالترتیب شامل نمودن دوباره شهروندان در جامعه که متشمل از جنگ جویان طالب، بیجا شده گان داخلی و شهروندانیکه از کشورهای همسایه پاکستان، جمهوری اسلامی ایران برمیگردند را در بر میگیرد و رهایی از نا امنی نسبی، جلوگیری از افزایش فقر و حفظ حقوق اساسی زنان میباشد.

پس از سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، اهداف انکشاف پایدار افغانستان نیز از مواردی است که واحدهای بودجوی این سکتور متعهد به تنظیم برنامه های خویش در مطابقت با آنها بوده و تلاش میکنند. اهداف انکشاف پایدار یک برنامه جامع و همه شمول

اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی بوده که توسط کشورهای عضو سازمان ملل با توافق آرا برای 15 سال آینده ی جهان بشریت ایجاد گردیده است. این برنامه، فعالیت های استراتژیک را در چارچوب 17 هدف انکشافی بگونه معیاری دنبال می کند. نظر به ماهیت کار کردی ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی، این سکتور در بر گیرنده 8 هدف، 22 تارگیت و 33 شاخص در سند ملی اهداف انکشاف پایدار میباشد. موضوعات چون محو فقر، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان، ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد برای همه، کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی، ساختن شهرها و شهرک های همه شمول، م صئون، مقاوم و پایدار، اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی و ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول از جمله اهداف عمده این سکتور در سند ملی اهداف انکشاف پایدار میباشد.

برنامه های واحد های بودجه وی سکتور مصئونیت اجتماعی که با اهداف انکشاف پایدار افغانستان مطابقت دارد، قرار شرح زیر اند:

هدف اول: (محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا) هدف چهار: حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، عادلانه و ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه، هدف پنجم: (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران، هدف هشتم: (تقویت رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و رشد اشتغال کامل، مناسب و مولد برای همه)، هدف دهم: (کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی)، هدف یازدهم: ساختن شهرها و شهرک های (human settlements) همه شمول، مصئون، مقاوم (resilient) و پایدار، هدف سیزدهم: اقدام فوری عملی در قسمت مبارزه با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن و هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر حسابه و همه شمول در تمام سطوح، می باشند. پروژه های انکشافی و برنامه ها در زمینه کاهش فقر، گر سنجی و سایر عرصه های توسعه ای این سکتور تمرکز دارند، از دید تمویل بودجه هم این سکتور درخور توجه جامعه جهانی و بودجه ملی بوده است.

امنیت



وضعیت مصرف بودجه (میلیون افغانی)	
2,161.30	مجموع بودجه
2,011.10	بودجه اختیاری
150.20	بودجه غیر اختیاری
611.56	مجموع مصرف
28%	فیصدی مصرف




وضعیت تطبیق پروژه های انکشافی	
عناوین	عمده
تکمیل شده	0
در حال تطبیق	26
آغاز نشده	0
متوقف شده	0
در حال تدارکات	1
مجموع پروژه ها	27
پیشرفت فیزیکی	20%


چگونگی تحقق بودجه انکشافی (میلیون افغانی)					وضعیت پروژه‌های انکشافی							
واحد بودجوی	تعداد پروژه	تکمیل	تحت کار	تحت روند تدارکات	متوقف	انگاز نگرديده	اوسط پيشرفت کار	اختیاری	غیر اختیاری	مجموع	مصرف بودجه	فیصدي مصرف
رياست عمومي امنيت ملي	2	0	2	0	0	0	1	235.00	0.00	235.00	0.00	0%
وزارت دفاع ملي	3	0	2	1	0	0	20	35.00	0.00	35.00	6.85	20%
رياست عمومي محافظت رياست جمهوري	3	0	3	0	0	0	10	260.00	0.00	260.00	11.53	4%
وزارت امور داخله	12	0	12	0	0	0	33	530.74	0.20	530.94	175.17	33%
وزارت امور خارجه	7	0	7	0	0	0	34	950.36	150.00	1,100.36	418	38%
مجموع	27	0	26	1	0	0	20%	2,011.10	150.20	2,161.30	611.56	28%

منبع: گزارش واصله از واحد های بودجوی و سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی CMRS/PMRS

مقایسه اوسط پیشرفت کار پروژه های انکشافی
سکتور طی ربع دوم سال های مالی 1399 و 1400

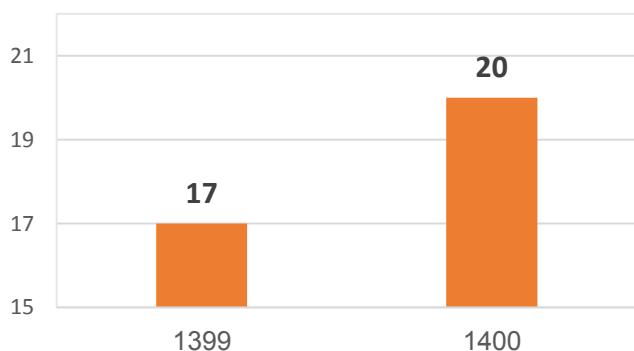

مقایسه فیصدی مصرف بودجه انکشافی سکتور طی
ربع دوم سال های مالی 1399 و 1400

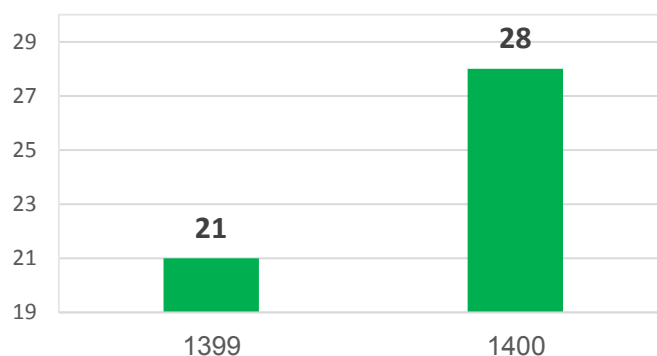

دستاوردهای عمده سکتور:

- تکمیل کار پروژه های اعمار تعمیر مهمانخانه ریاست امنیت ملی بلخ، اعمار تهنانه های سرحدی ولایت کندز و هرات و پروژه ترمیم اساسی سفارت ج.ا.ا مقیم لند؛
- امضاء تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت امور خارجه، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره احصائیه ملی و معلومات جهت تسریع روند صدور پاسپورت ماشین خوان، توزیع تذکره الکترونیکی و تثبیت هویت هموطنان ما در کشور ایران؛
- عملی سازی نقشه راه خط آهن مزار – کابل – پیشاور که یاد داشت تفاهم آن میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا گردید؛
- تدوین پالیسی های تامین حقوق و حفاظت از اطفال که به رویت آن پولیس ملی از لیست خاکستری سازمان ملل متحد بیرون گردیده است؛
- تدوین پالیسی آزار و اذیت زنان به منظور رعایت تنوع جنسیتی و رسیدگی آنی به شکایات منسوبین اناث وزارت امور داخله.

نتیجه گیری:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال مالی 1400 همانند سال های گذشته جهت رسیدن به اهداف استراتژیک انکشافی و ایجاد یک جامعه مرفه تلاش ورزیده است. با وجود چالش های متعددی سیاسی و اقتصادی، هنوز هم این تلاش ها با کمک جامعه بین المللی ادامه دارد.

برای سال مالی 1400، جمعاً به تعداد 548 پروژه انکشافی منظور گردیده که بودجه منظور شده آن ها بالغ بر (168.24) میلیارد افغانی گردیده که بیشترین این پروژه ها متعلق به سکتور های زیربنا و منابع طبیعی، معارف، زراعت و انکشاف دهات و اقتصاد می باشد.

طی ربع دوم سال مالی 1400، از مجموع 548 پروژه انکشافی، تعداد 365 پروژه با فیصدی های مختلف پیشرفت داشته و در حال تطبیق می باشند، تعداد 36 پروژه متوقف، 54 پروژه کار آن تا اکنون آغاز نگردیده، 30 پروژه تحت مراحل تدارکاتی و همچنان از تعداد 20 پروژه انکشافی گزارش ارائه نگردیده است. اوسط پیشرفت کار پروژه های انکشافی طی این ربع، 23 درصد بوده که در مقایسه با ربع دوم سال مالی پار که 22 درصد بود، افزایش یک درصدی را نشان می دهد.

برعلاوه از مجموع (168.24) میلیارد افغانی بودجه منظور شده، واحد های بودجوی مبلغ (37.71) میلیارد افغانی آن را به مصرف رسانیده اند که (22) در صد بودجه انکشافی را تشکیل می دهد.

اما با وجود آن در این ربع، در سکتور های مختلف، به تعداد 19 پروژه انکشافی تکمیل گردیده است.

با در نظر داشت تحلیل و ارزیابی پیرامون ارقام و معلومات واصله از واحد های محترم بودجوی، چنین به نظر می رسد که سطح مصرف بودجه انکشافی طی ربع دوم سال مالی 1400 در مقایسه با سال مالی پار، 8 درصد کاهش داشته و دلیل عمده آن تاخیر در تصویب سند بودجه ملی بوده که روند تطبیق و پیشرفت کار پروژه های انکشافی را متاثر ساخته است.

تحلیل های انجام شده مبین این امر است که سرمایه گذاری بالای پروژه های انکشافی سبب بلند رفتن سطح اشتغال، کاهش فقر، رشد اقتصادی و تقلیل میزان بیکاری شهروندان گردیده که این نیل در نتیجه تحقق اهداف کلان ستراتیژیک دولت به منظور انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی در چتر برنامه های بلند مدت صورت می گیرد.

وزارت اقتصاد اراده دارد تا با در نظر داشت دریافت های این گزارش، به حمایت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با ادارت و واحد های بودجوی کار مینماید تا با تطبیق پلان های انکشافی به اهداف پلان شده سکتوری و تارگیت ها و شاخص پلانی که در سند اهداف انکشافی پایدار افغانستان (A-SDGs) و اهداف که در دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF2) انعکاس یافته تحقق یابد.

در اخیر از همکاری های تمام واحد های محترم بودجوی ابراز تشکر نموده و نیز توقع برده میشود تا قسمت ارایه به موقع گزارش ربعوار میزان تطبیق پروژه های انکشافی شان و شاخص های کاری پلانی شان توجه جدی مبذول دارند.

چالش ها و مشکلات:

- عدم ثبت معلومات دقیق پروژه های انکشافی منجانب ادارات در سیستم گزارشدهی مرکزی وزارت اقتصاد (CMRS) به خصوص مشکل تطبیق پروژه ها در قسمت ملاحظات و پلان تطبیقی پروژه ها در سیستم متذکره؛
- وجود مشکلات امنیتی و استملاک زمین در قریه چهار توت ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب (در پروژه سروی، دیزاین و ساختمان بند آبی دهن دره)؛
- عدم برق رسانی در قریه جات ولسوالی کیله گی ولایت بغلان که اهالی به نسبت آن مانع کار در ساحه گردیده اند (پروژه سب استیشن 500 کیلوولت در دشت الوان شهر پلخمري و لین انتقال 500 کیلوولت الی ارغندی و سب ستیشن 500 کیلوولت در ارغندی)؛
- مشکلات امنیتی، استملاک زمین و جایداد های اهالی در مسیر لین و نسبت ختم معیاد قرار داد های فرعی (ماین پاکی) پروژه مذکور در 88 فیصد پیشرفت کار طی دو ربع سال مالی 1400 متوقف میباشد (پروژه لین انتقال 220 کیلوولت غزنی الی کندهار)؛
- مشکلات امنیتی و استملاک اراضی در تمام مسیر لین بخصوص در ولایات بلخ و جوزجان (پروژه تمدید لین انتقال 500 کیلوولت از شبرغان الی دشت الوان تمدید لین انتقال 500 کیلووات شبرغان الی دشت الوان شهر پلخمري و تمدید لین انتقال 220 کیلووات شبرغان الی اندخوی)؛
- کافی نبودن شرکت های وارد کننده سامان آلات لابراتوار در کشور و طولانی شدن پروسه خریداری تجهیزات لابراتوار علوم طبی؛
- نبود بودجه مشخص جهت نظارت حمایتی از بخش نرسنگ و قابلیت شفاخانه های ولایتی؛
- کمبود پرسونل تکنیکی و خدماتی برای آمریت انکشاف رهنمود ها و پروتوکول ها و دیپارتمنت صحت محابس؛
- متوقف بودن کار اعمار مهمانخانه مرکزی ریاست کوچی ها از جانب شاروالی کابل بیشتر از سه سال.

پیشنهادات:

- استخدام افراد مسلکی و یا تریننگ کارمندان بخش پلان ادارات جهت ثبت معلومات لازم در سیستم گزارشدهی مرکزی وزارت اقتصاد (CMRS)؛
- همکاری ارگان های امنیتی و وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تامین امنیت و استملاک زمین (در پروژه سروی، دیزاین و ساختمان بند آبی دهن دره)؛
- تامین برق ساحات قریه جات ولسوالی کیله گی ولایت بغلان (پروژه سب استیشن 500 کیلوولت در دشت الوان شهر پلخمیری و لین انتقال 500 کیلوولت الی ارغندی و سب ستیشن 500 کیلوولت در ارغندی)؛
- همکاری ارگان های امنیتی و اداره اراضی در تامین امنیت و استملاک اراضی در پروژه لین انتقال و توزیع برق از شمال به جنوب کشور و ارتقاء ظرفیت برشنا شرکت در عرصه تجارتي، عملیاتی مالی و اداری (PTEC)؛
- همکاری ارگان های امنیتی و اداره اراضی در تامین امنیت و استملاک اراضی (پروژه تمدید لین انتقال 500 کیلو ولت از شبرغان الی دشت الوان تمدید لین انتقال 500 کیلووات شبرغان الی دشت الوان شهر پلخمیری و تمدید لین انتقال 220 کیلووات شبرغان الی اندخوی)؛
- زمینه سازی برای جلب بیشتر شرکت های واردکننده سامان آلات لابراتوار طبی و ساده سازی پروسه خریداری وسایل متذکره؛
- اختصاص بودجه مشخص جهت نظارت از بخش نرسنگ و قابلیت شفاخانه های ولایتی؛
- استخدام پرسونل تخنیکی و خدماتی برای آمریت انکشاف رهنمود ها و پروتوکول ها و دیپارتمنت صحت محابس جهت انجام بهتر امور و خدمات مؤثر؛
- ایجاد یک کمیته با صلاحیت متشکل از ریاست عمومی کوچی ها، شاروالی محترم کابل و یکی از ادارات با صلاحیت حکومت جهت حل معضله پروژ متوقف (اعمار تعمیر اداری کوچی ها) که بیشتر از سه سال میشود در حالت مبهم قرار دارد.
